



Gerência de Projetos de Software

Prof. Dr. Pedro A. Oliveira

Gerência do Escopo de Projetos



Conteúdo desta Videoaula

- **Introdução**
- **Conceito de Escopo**
- **Processos da gerência de escopo**
- **WBS (EAP)**

Introdução

Na sua opinião o que deve ser definido primeiro para iniciar um projeto?

- Tempo?
- Custo?
- Equipe?

Pense um pouco...

Que tal começar pelo ESCOPO?



Conceito de Escopo

O escopo do **projeto** indica o que será abrangido pelo projeto, em termos de atividades/trabalho.

Delimita o que deve ser feito no projeto.

Ex: realizar o levantamento de requisitos, a análise, implementação, testes, etc.


Também pode-se delimitar o que não será incluído no projeto (contra-escopo).

Conceito de Escopo

O escopo do **produto** determina o que será abrangido no produto.

Portanto deve especificar os componentes (partes) do produto.

Ex: módulos ou funções do produto, partes constituintes da arquitetura.




Conceito de Escopo

- Deve-se incluir TUDO que deve ser feito e excluir o que não deve ser feito.
- Pode ser expresso textualmente ou por meio de figuras ou diagramas.
- É uma das primeiras preocupações num projeto, logo após a definição do objetivo.

Relação entre Escopo e outras Áreas



Obs: escopo não se relaciona apenas a essas áreas.



Processos de Gerenciamento de Escopo - PMBOK

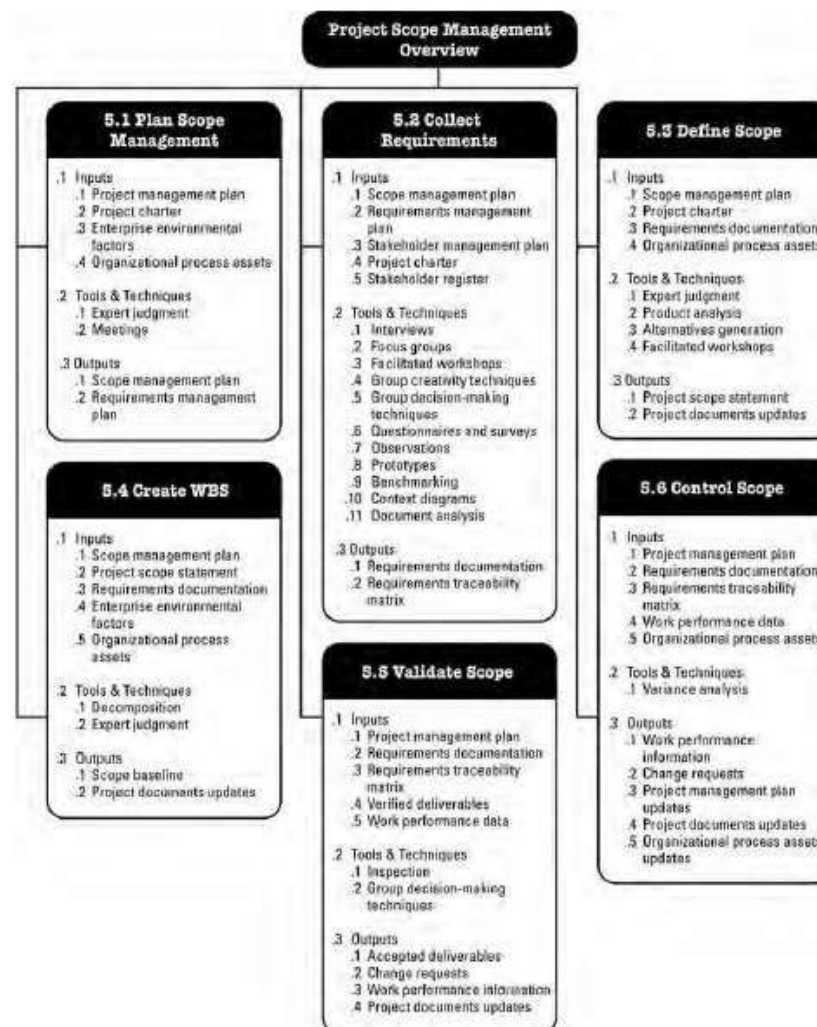


Figura 5-1. Visão geral do gerenciamento do escopo do projeto

Processos de Gerenciamento da Integração e do Escopo - PMBOK

Knowledge Areas	Project Management Process Groups				
	Initiating Process Group	Planning Process Group	Executing Process Group	Monitoring and Controlling Process Group	Closing Process Group
4. Project Integration Management	4.1 Develop Project Charter	4.2 Develop Project Management Plan	4.3 Direct and Manage Project Work	4.4 Monitor and Control Project Work 4.5 Perform Integrated Change Control	4.6 Close Project or Phase
5. Project Scope Management		5.1 Plan Scope Management 5.2 Collect Requirements 5.3 Define Scope 5.4 Create WBS		5.5 Validate Scope 5.6 Control Scope	

Processos da área de Escopo


5.1 Planejar o gerenciamento do escopo—O processo de criar um plano de gerenciamento do escopo que documenta como os escopos do projeto e do produto serão definidos, validados e controlados.

5.2 Coletar os requisitos—O processo de determinar, documentar e gerenciar as necessidades e requisitos das partes interessadas a fim de atender aos objetivos do projeto.

Processos da área de Escopo

5.3 Definir o escopo—O processo de desenvolver uma descrição detalhada do projeto e do produto.


5.4 Criar a EAP—O processo de subdividir as entregas e o trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis.



Processos da área de Escopo

5.5 Validar o escopo— O processo de formalizar a aceitação das entregas concluídas do projeto.


5.6 Controlar o escopo—O processo de monitorar o status do escopo do projeto e do produto e gerenciar as mudanças feitas na linha de base do escopo.



Processo “Criar EAP”

A Estrutura Analítica de Projeto (EAP), em inglês Work Breakdown Structure (WBS) é o artefato mais importante da área de escopo.

Geralmente construída na forma gráfica, como uma árvore, ela permite ter uma visão geral do escopo de um projeto.



EAP (WBS) com Pacotes de Trabalho

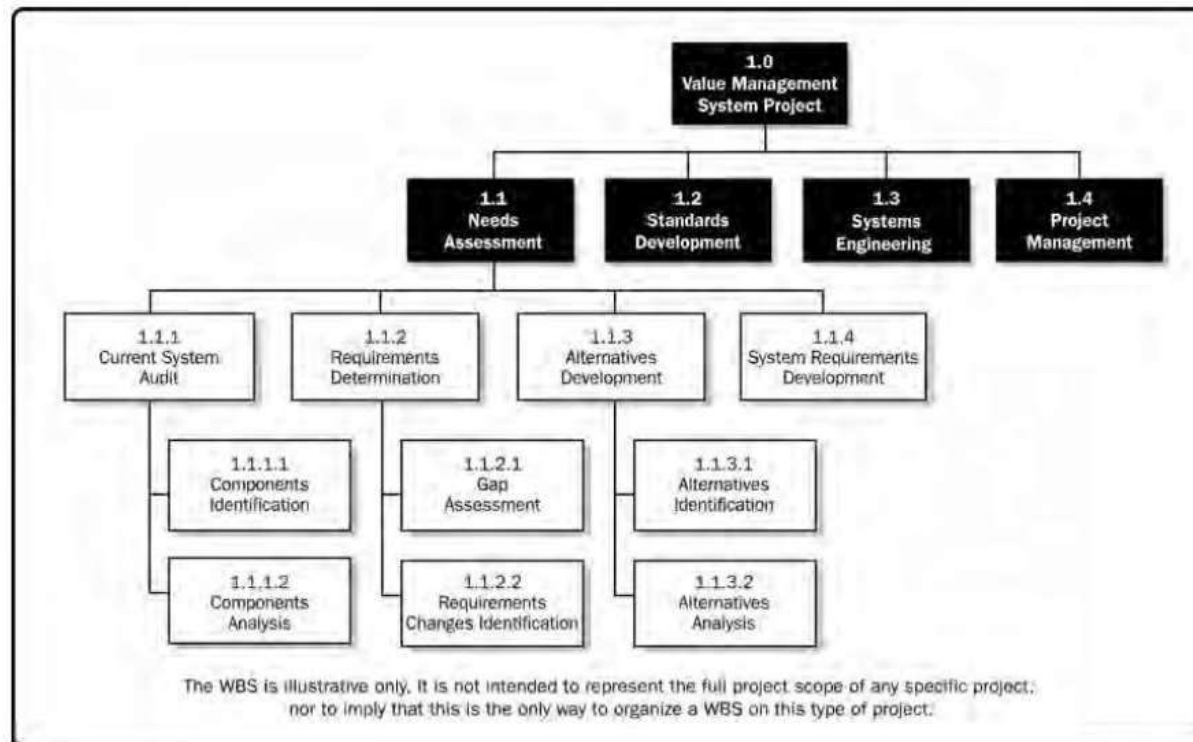



Figura 5-11. Amostra de EAP decomposta em pacotes de trabalho

Pacote de Trabalho

Pacotes de trabalho constituem as atividades de menor nível da EAP, ou seja, são as tarefas elementares.

Normalmente são entregues a uma única pessoa para realiza-las.

Ex: implementar um caso de uso ou história de usuário, testar uma funcionalidade.



EAP (WBS) Organizada por Fases

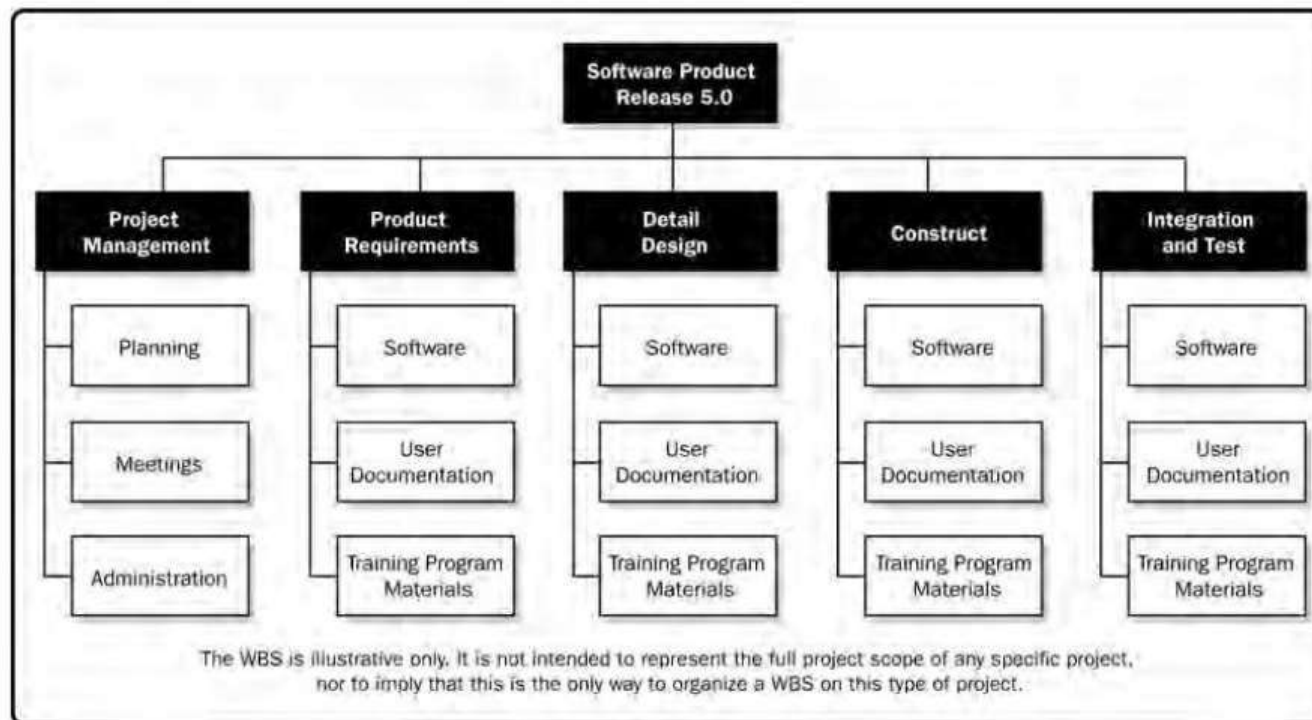


Figura 5-12. Amostra de EAP organizada por fases

EAP (WBS) Organizada por Entregas


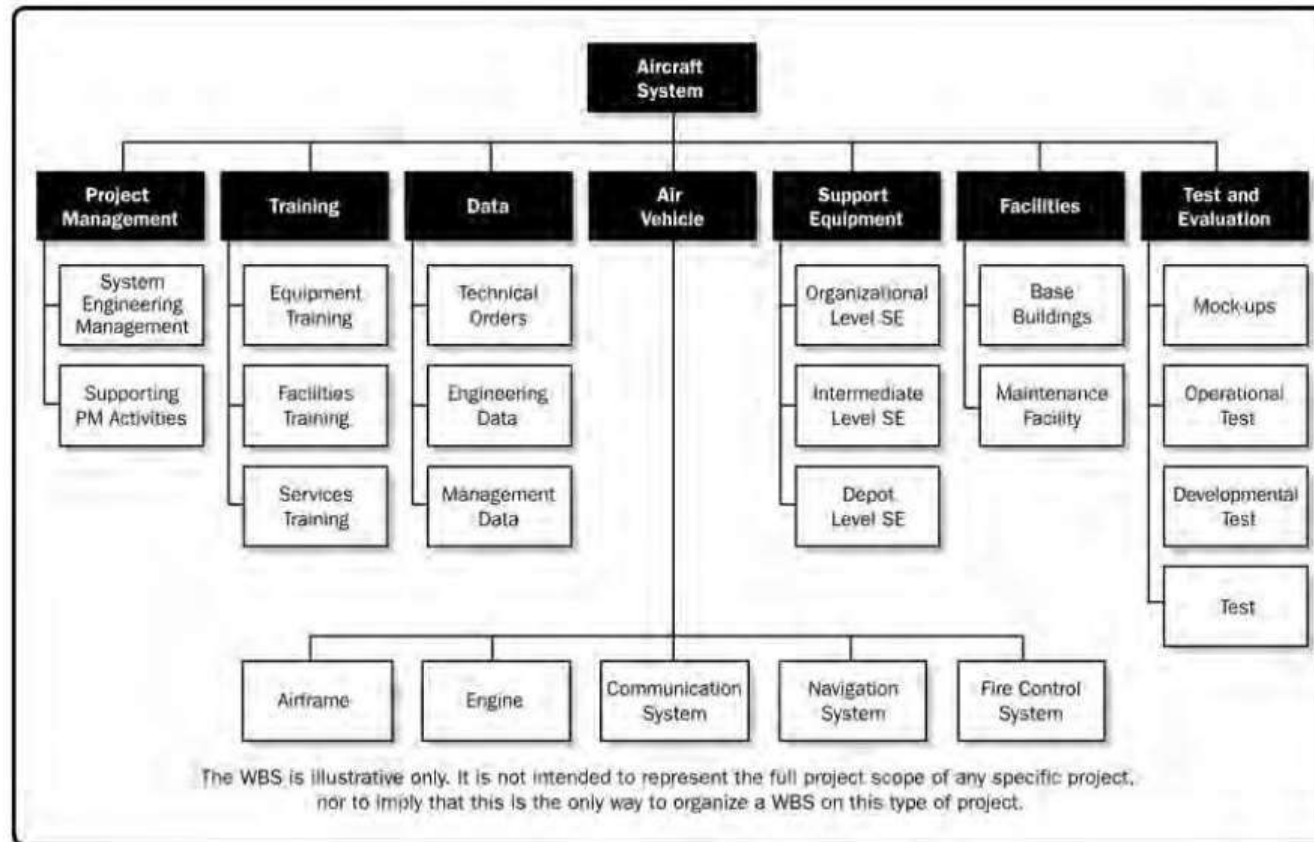


Figura 5-13. Exemplo de EAP com entregas principais

Dicionário da WBS (EAP)


Juntamente com a EAP recomenda-se produzir um dicionário que facilite seu entendimento, descrevendo resumidamente cada atividade apresentada na estrutura.

Pode-se também gerar estruturas no modelo da EAP (em árvore) que agreguem informações como custos e recursos de cada atividade.

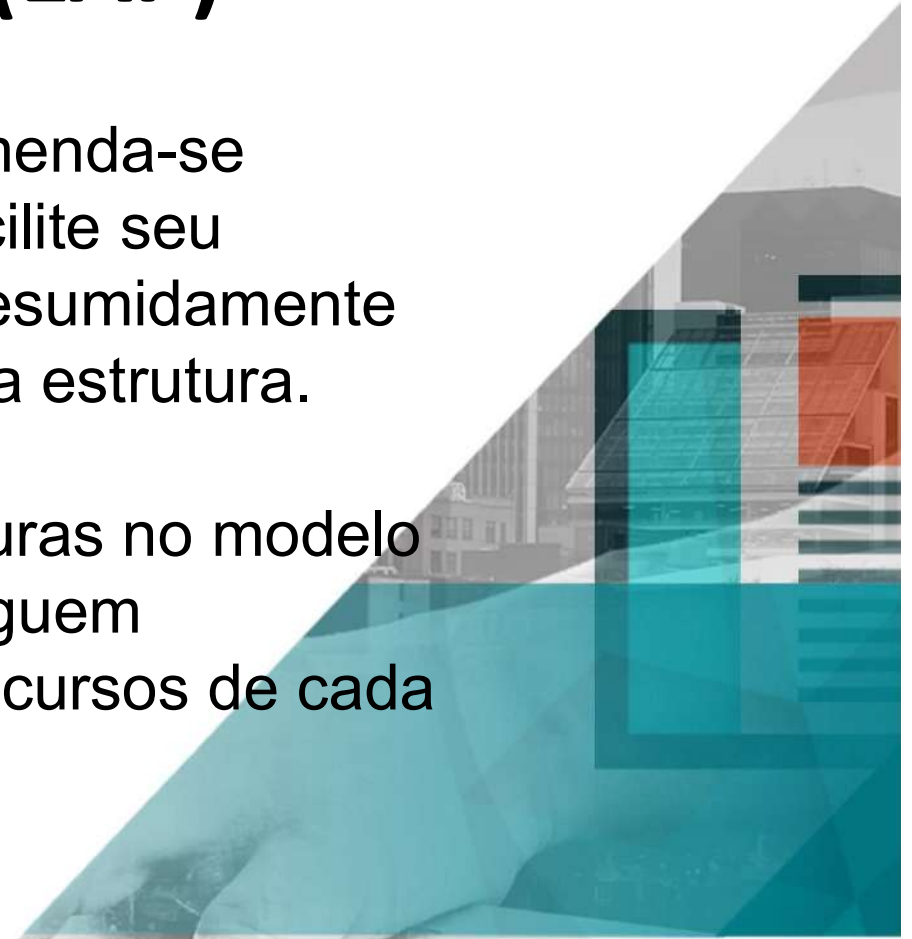

Nível da WBS (EAP)

Cada nível hierárquico da árvore de decomposição de tarefas pode ser numerado: nível 1, 2, 3, etc:

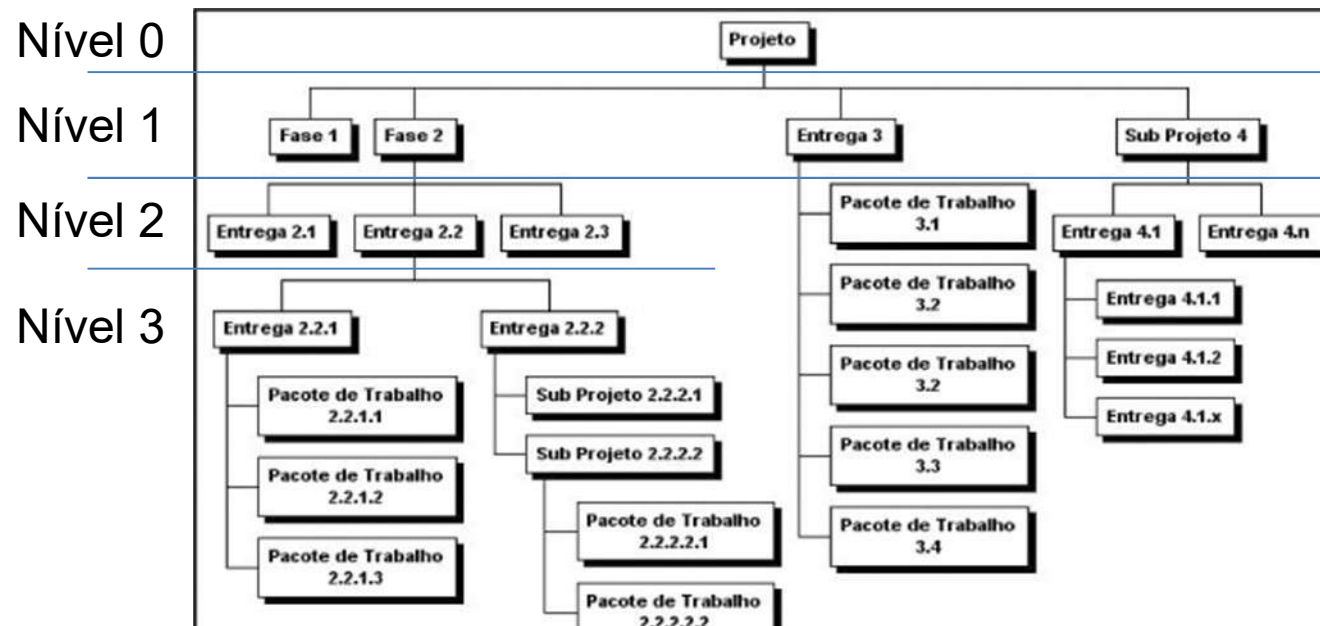


Identificação das Atividades da WBS (EAP)

Também é comum identificar cada atividade da EAP atribuindo-lhe uma numeração, que pode facilitar a identificação de um dado elemento na árvore.

Na figura anterior as atividades já estão identificadas pela sua numeração correspondente.

Esse número identificador é conhecido como **código da EAP**.



Referências

PMI. *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK). sixth Ed.* PMI, 2017.

