



Gerência de Projetos de Software

Prof. Dr. Pedro A. Oliveira

Gerência de Custos do Projeto



Conteúdo desta Videoaula

- **Introdução**
- **Conceito de Custo**
- **Processos da gerência de Custos**
- **Orçamento do Projeto**


Introdução

Uma das primeiras perguntas que o cliente faz ao gerente de projeto é:

- Quanto vai custar?

Esta pergunta, aparentemente singela, não é tão simples de ser respondida.

Calcular o custo de um projeto exige conhecer bem seu escopo, visando determinar cada item de custo.

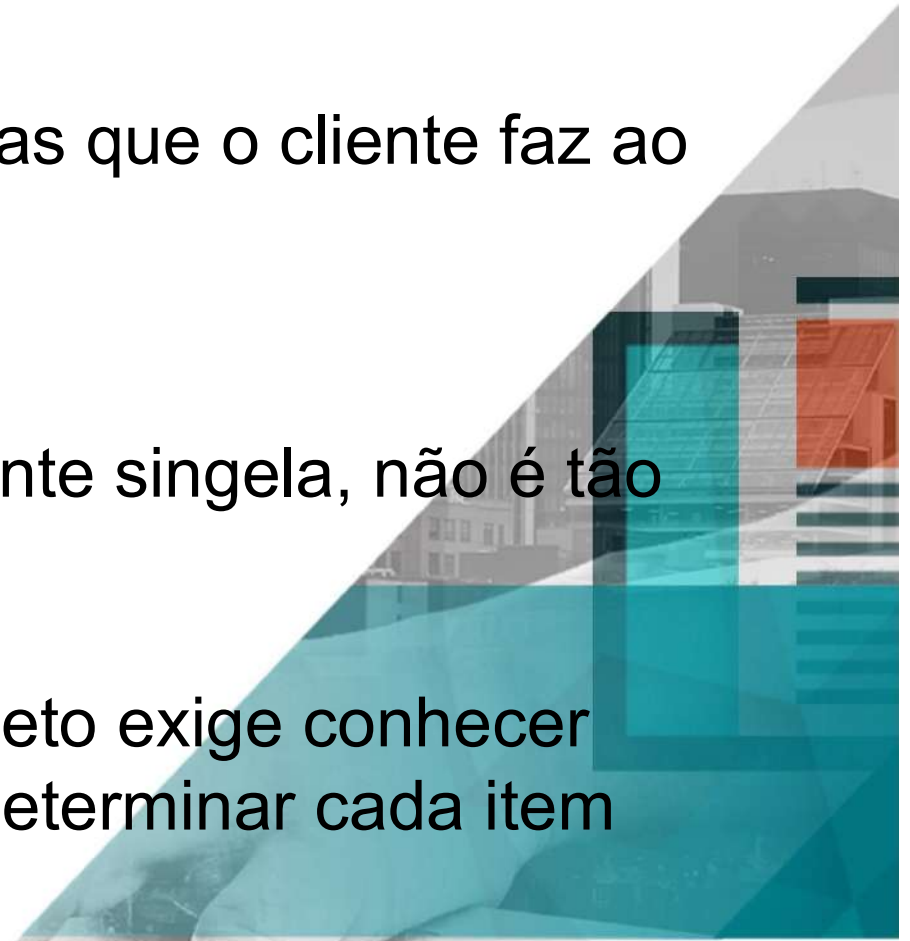


Introdução

Custo é um elemento do projeto que se relaciona diretamente com outras áreas, dentre as quais:

- Escopo;
- Cronograma;
- Recursos.

Se o escopo de um projeto muda isto reflete nos custos, assim como variações no cronograma e no uso dos recursos.

Ex: acrescentar novas funcionalidades ao escopo aumenta o custo.

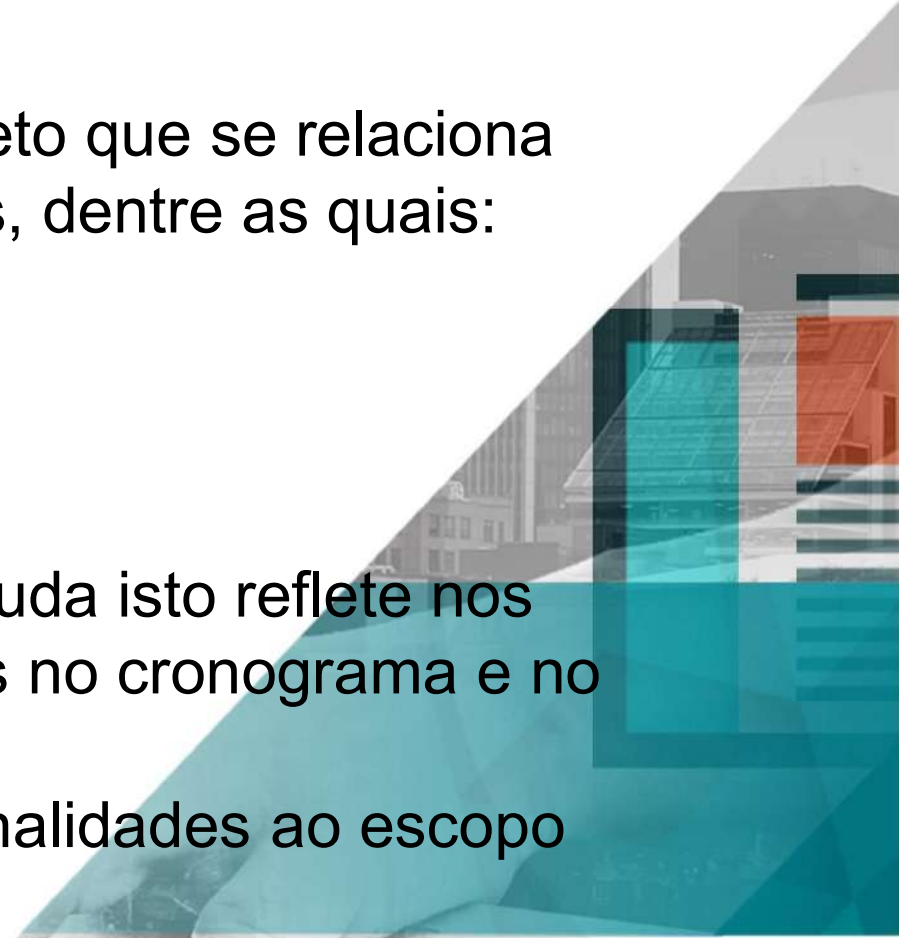

Conceito de Custo

Segundo PMBoK v6 “O gerenciamento dos custos do projeto inclui os processos usados em planejamento, estimativa, orçamento, financiamento, gerenciamento e controle dos custos, para que o projeto possa ser realizado dentro do orçamento aprovado.”

Nesse contexto o “Gerenciamento dos Custos do Projeto preocupa-se principalmente com o custo dos recursos necessários para completar as atividades do projeto.”


Conceito de Custo

Algumas considerações sobre a área de custo:

- Diferentes *stakeholders* podem mensurar os custos de diferentes formas – ex: cliente e fornecedor.
- Não se consegue precisão na avaliação dos custos de um projeto, a não ser ao final do mesmo.
- Neste sentido, a precisão das estimativas de custo é maior em ambientes estáveis e em projetos que seguem metodologias tradicionais.

Processos de Gerenciamento de Custos - PMBOK

Fonte: PMBOK, 6ª. Ed.

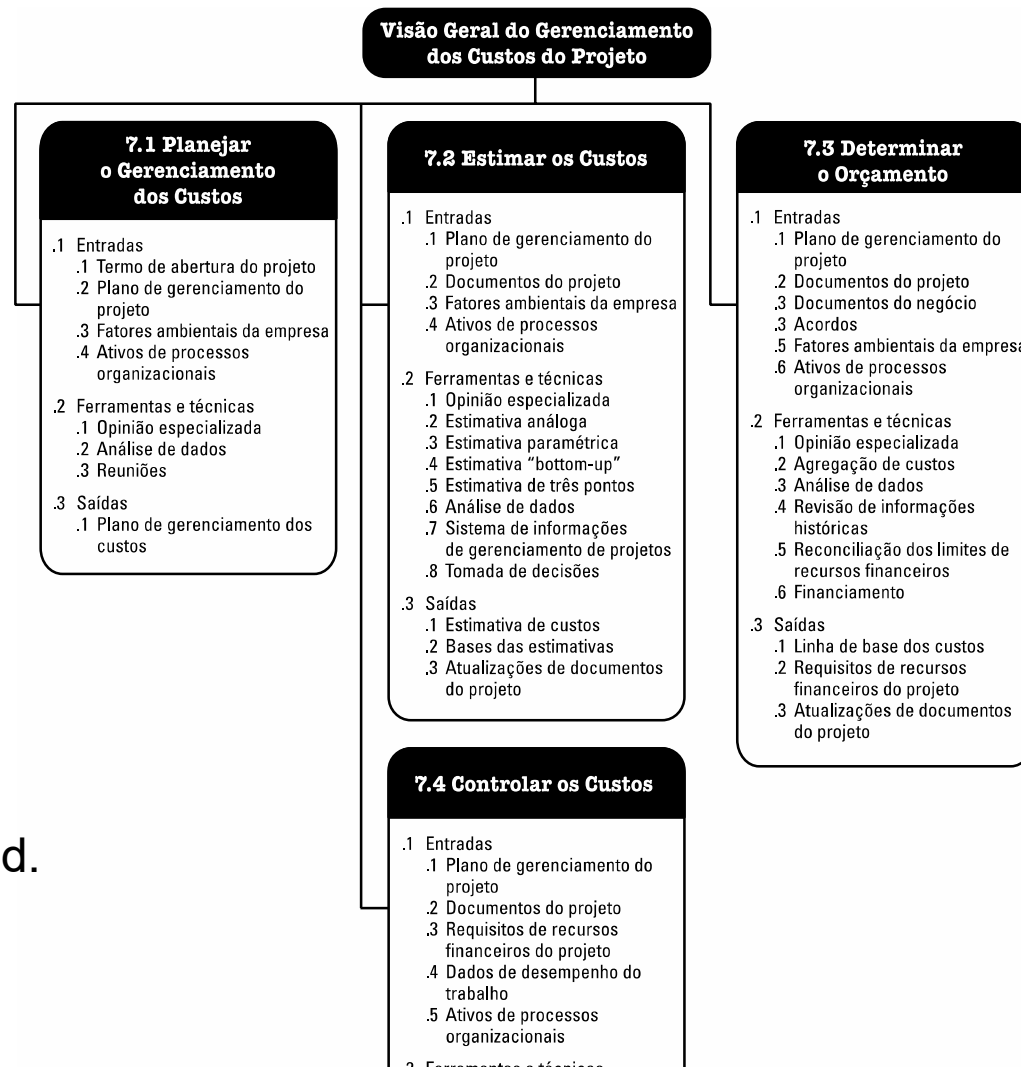

Processos de Gerenciamento de Custos - PMBOK

Áreas de conhecimento	Grupos de processos de gerenciamento de projetos				
	Grupo de processos de iniciação	Grupo de processos de planejamento	Grupo de processos de execução	Grupo de processos de monitoramento e controle	Grupo de processos de encerramento
7. Gerenciamento dos custos do projeto		7.1 Planejar o Gerenciamento dos Custos 7.2 Estimar os Custos 7.3 Determinar o Orçamento		7.4 Controlar os Custos	


Fonte: PMBOK, 6ª. Ed.

Processos da área de Custos

7.1 Planejar o Gerenciamento dos Custos—O processo de definir como os custos do projeto serão estimados, orçados, gerenciados, monitorados e controlados.

7.2 Estimar os Custos—O processo de desenvolver uma aproximação dos recursos monetários necessários para terminar o trabalho do projeto.

Fonte: PMBOK, 6ª. Ed.

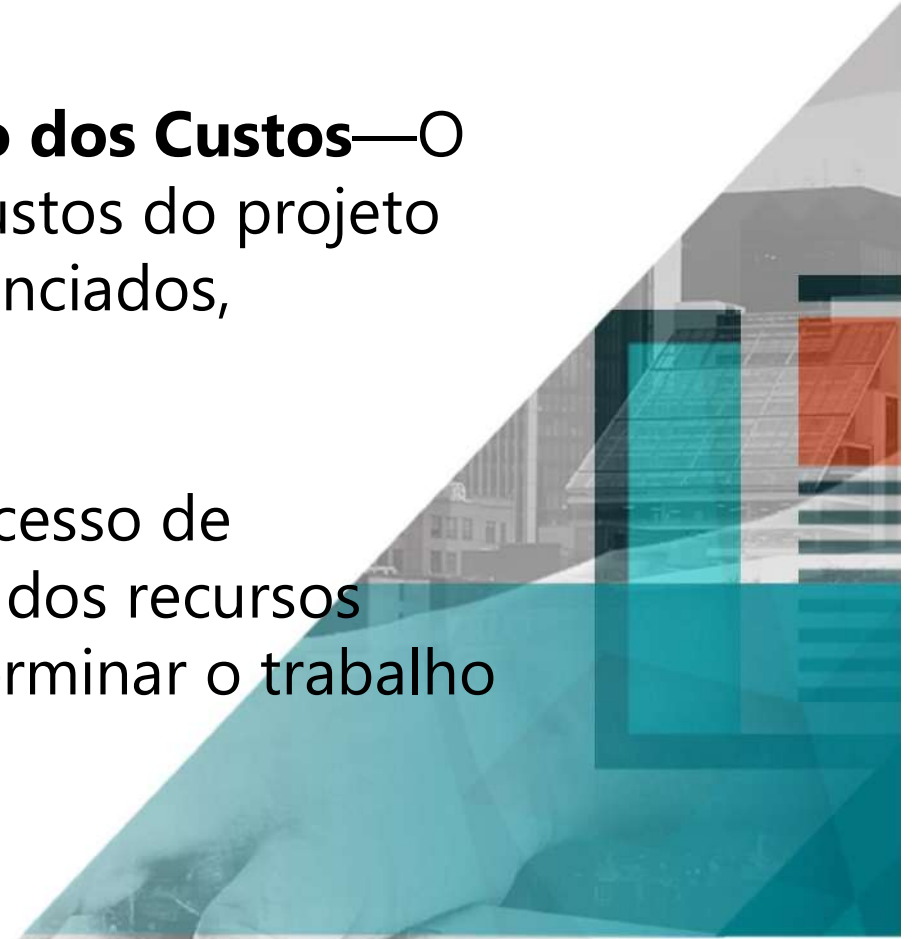


Processos da área de Custos

7.3 Determinar o Orçamento—Processo que agrega os custos estimados de atividades individuais ou pacotes de trabalho para estabelecer uma linha de base dos custos autorizada.

7.4 Controlar os Custos—O processo de monitoramento do status do projeto para atualizar custos e gerenciar mudanças da linha de base dos custos.

Fonte: PMBOK. 6ª. Ed.

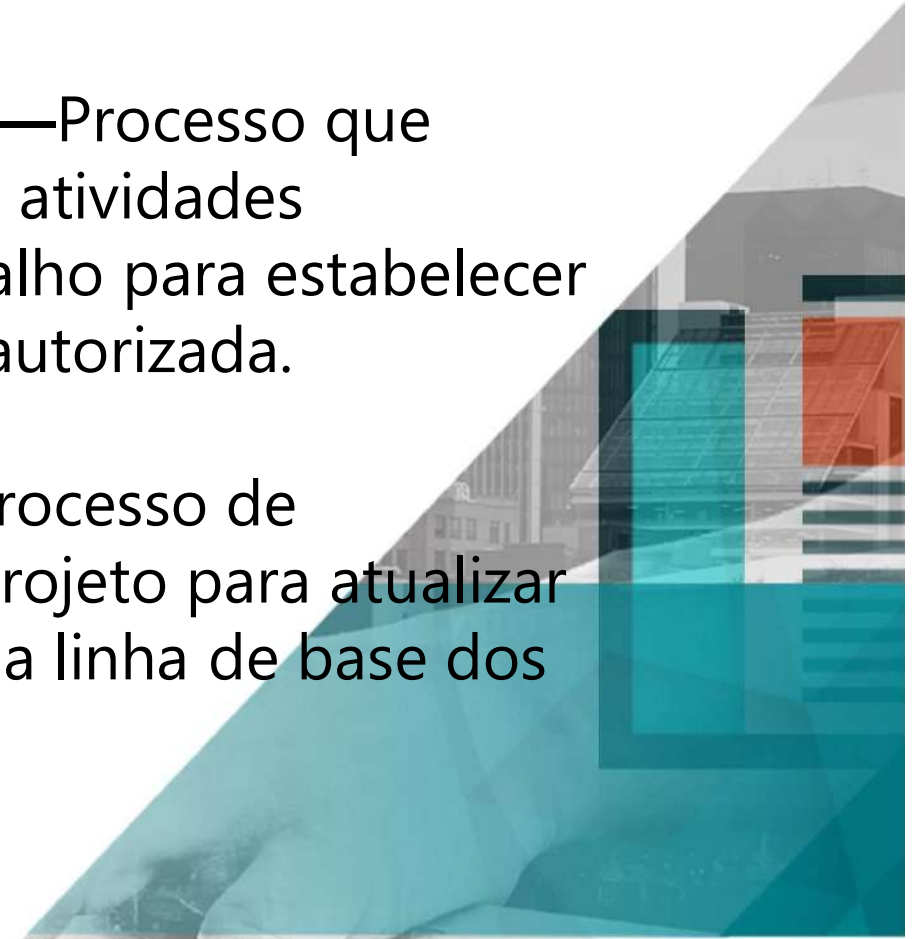


Processo 7.3 – Determinar o Orçamento

“O processo Determinar o Orçamento agrega os custos estimados de **atividades individuais ou pacotes de trabalho** para estabelecer uma **linha de base dos custos** autorizada.

O principal benefício deste processo é a determinação da linha de base dos custos para o monitoramento e o controle do desempenho do projeto.

Esse processo é realizado uma vez ou em pontos predefinidos no projeto.”

Fonte: PMBOK, 6ª. Ed.

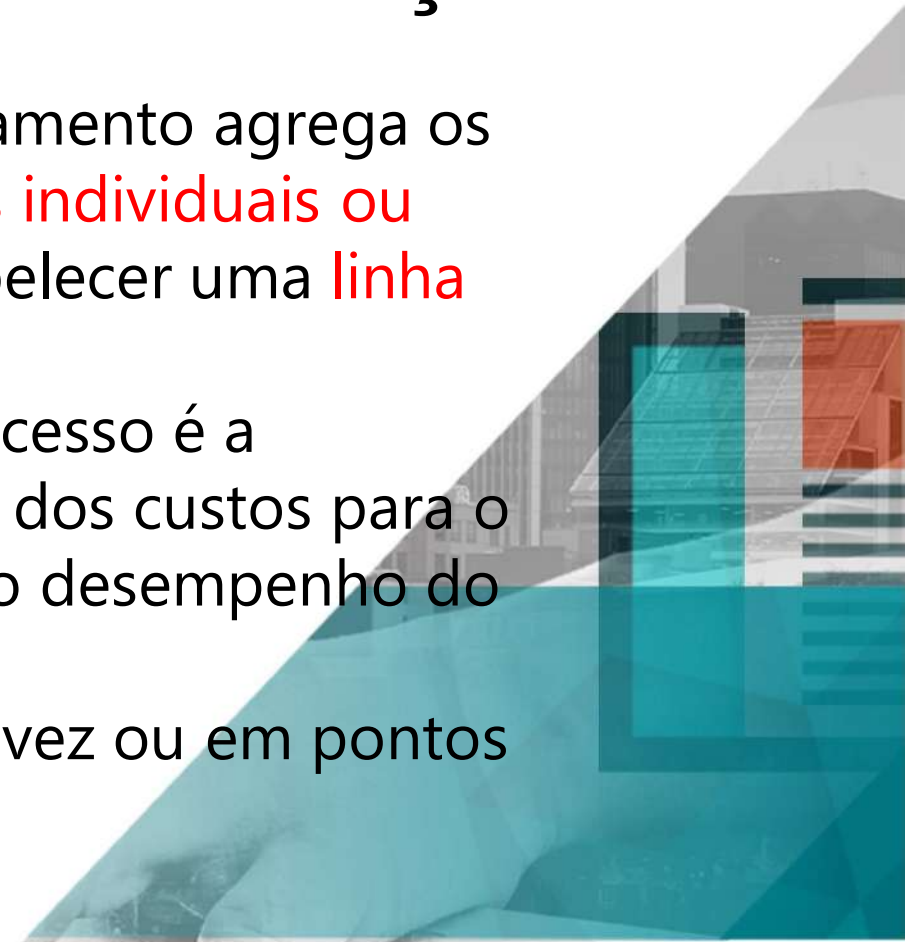

Orçamento do Projeto

O orçamento do projeto constitui um artefato fundamental para a área de Custos, sendo uma referência durante todo seu ciclo de vida.

Deve conter os valores individuais dos itens de custo e o valor total, que é a soma de todos os itens de custo ponderados pelas suas quantidades.


Qualquer alteração no orçamento de um projeto deve ser justificada e aprovada pelo responsável.



Orçamento do Projeto

O Orçamento de um projeto deve conter, além dos valores a serem gastos no mesmo, as datas em que esses valores serão comprometidos.

Outro aspecto que deve ser ressaltado é que o cronograma do projeto pode ser visto sob a **perspectiva do cliente**, ou seja, do que este terá de desembolsar, ou na **perspectiva do fornecedor**, que vai considerar as entradas (recebimentos) e saídas (gastos).

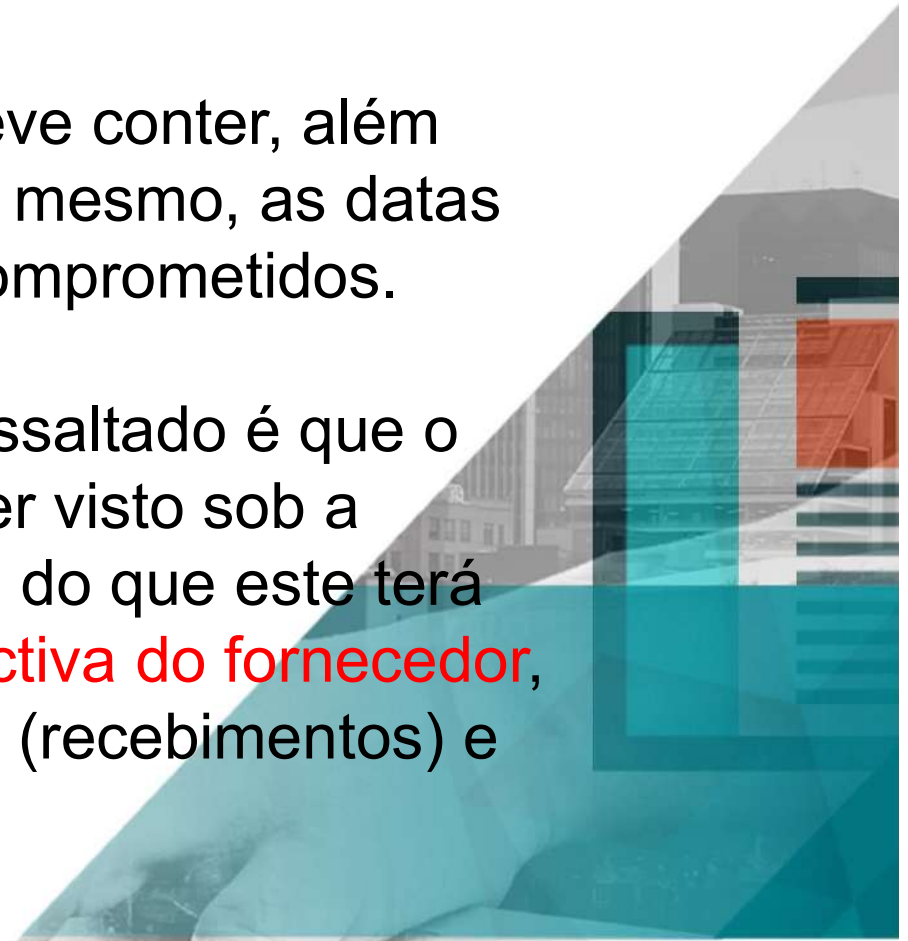

Orçamento do Projeto

ORÇAMENTO	
Recursos Necessários	(R\$)
Recursos humanos	200.000,00
Hardware	25.000,00
Rede	2.400,00
Software	24.000,00
Serviços	5.000,00
TOTAL	256.400,00

Referências

PMI. *A Guide to the Project Management Body of Knowledge* (PMBOK). *sixth Ed.* PMI, 2017.

