Processos da Gerência de Projetos (PMBOK)

Prof. Dr. Pedro Alves de Oliveira

Processos do PMBOK 6: Processos de Planejamento.

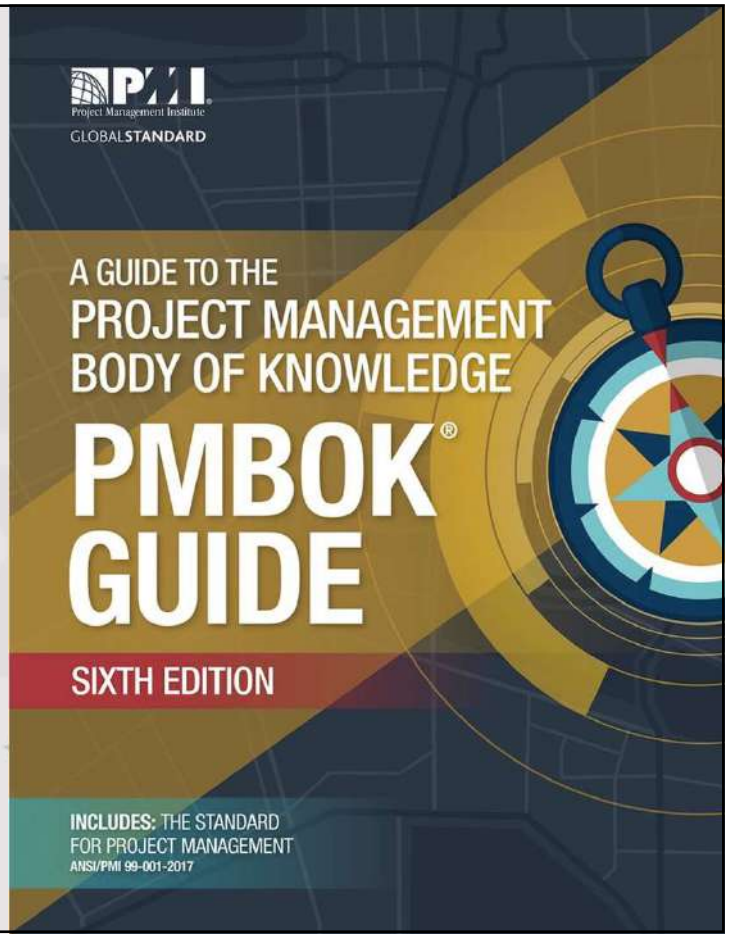

Grupos de Processos de GP

- PMBOK versão 6 agrupa os 49 processos em 5 grupos de processos, a saber:
- Iniciação;
- **Planejamento;**
- Execução;
- Monitoramento e Controle;
- Encerramento.

Grupo de Processos de Planejamento

Os processos de Planejamento constituem um importante conjunto de atividades de planejamento a serem realizadas após o início do projeto, sendo fundamentais para viabilizar seu sucesso.

Geralmente essas atividades são realizadas pelo gerente de projeto juntamente com a equipe, mas algumas atividades podem envolver também outros *stakeholders*.

Processos de todas as 10 áreas de gerência de projeto devem ser planejados.

Grupo de Processos de Planejamento

Alguns planos são gerados como saída, sendo consolidados no **Plano de Gerenciamento de Projeto** (Plano de Projeto), que é um documento da área de **Integração**.

O Plano de Projeto é basicamente um plano integrado, que contempla o planejamento de todas as áreas de gerência de projeto.

Os principais autores da área de gerência de projeto atribuem grande importância aos processos de planejamento, que são a base para o futuro monitoramento e controle do projeto.

Grupo de Processos de Planejamento

Este grupo de processos permite planejar um projeto, ou seja, definir como fazer. O único processo da área de Integração é:
4.2 – Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto: este é o processo que integra os diversos planos elaborados para um projeto num plano integrado.
Obs: lembrar que os artefatos de planejamento são conhecidos geralmente pelo termo “plano”.

4.2	INTEGRAÇÃO
	Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto

Fonte: PMBOK (2018).

Grupo de Processos de Planejamento

Este grupo de processos permite planejar um projeto, ou seja, definir como fazer. Os processos da área de planejamento de Escopo são:

5.1 – Planejar o gerenciamento do escopo: permite planejar em detalhes o escopo do projeto.

5.2 – Coletar os requisitos: consiste em obter os requisitos para o projeto.

5.3 – Definir o escopo: neste processo o escopo do projeto é definido de forma completa.

5.4 – Criar a EAP: processo responsável por definir a Estrutura Analítica de Projeto.

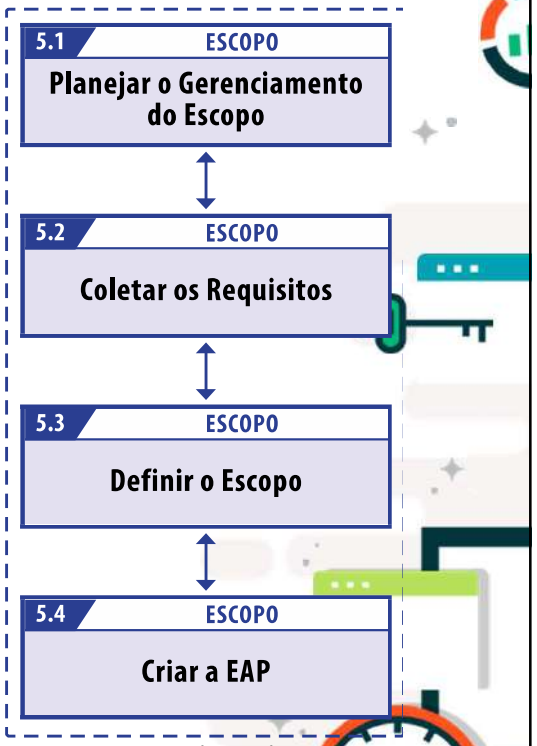

Fonte: PMBOK (2018).

Estrutura Analítica de Projeto (EAP)

Exemplo: projeto Feira Hippie

Fonte: o próprio autor.

Grupo de Processos de Planejamento

Os processos de Planejamento da área de Cronograma são:

6.1. Planejar o Gerenciamento do Cronograma: prepara as atividades que visam elaborar o cronograma do projeto.

6.2. Definir as Atividades: antes de produzir o cronograma é necessário definir quais são as atividades que compõem o projeto.

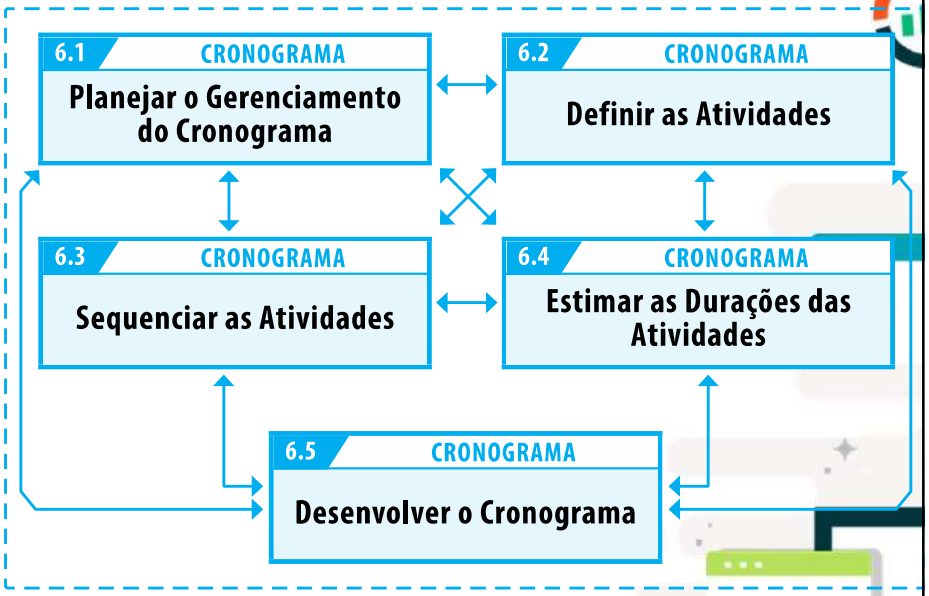

Fonte: PMBOK (2018).

Grupo de Processos de Planejamento

(Cont.)

6.3. Sequenciar as Atividades: Uma vez definidas as atividades deve-se estabelecer suas dependências.

6.4. Estimar as Durações das Atividades: processo de estimativa de tarefas.

6.5. Desenvolver o Cronograma: esta é a atividade que cuida de elaborar o cronograma propriamente dito.

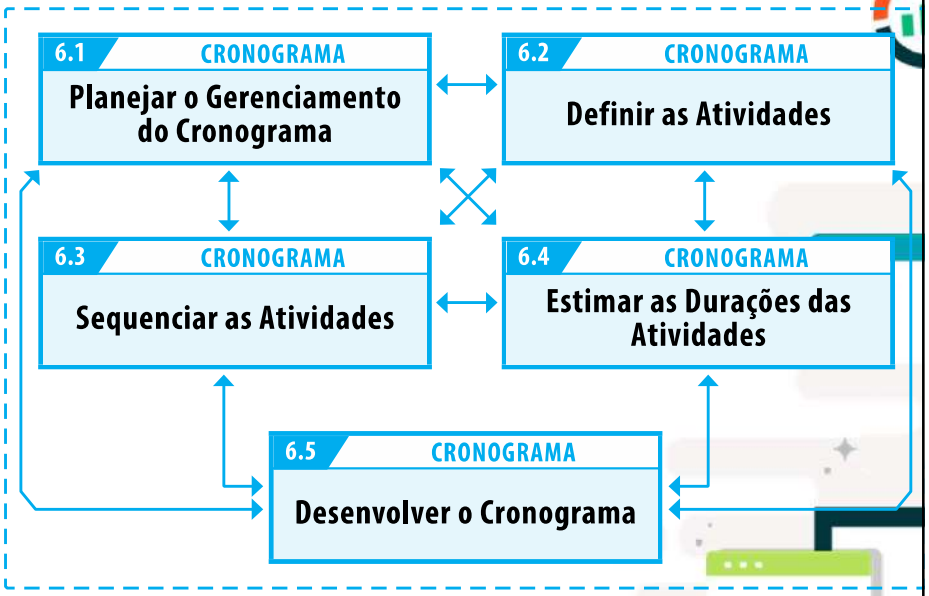

Fonte: PMBOK (2018).

Grupo de Processos de Planejamento

Os processos de Planejamento da área de Custos são:

7.1. Planejar o Gerenciamento dos Custos: Consiste de preparar as atividades da área de custos.

7.2. Estimar os Custos: para estimar custos é necessário empregar técnicas ou mesmo estabelecer algum tipo de estimativa *ad hoc*. Ex. de técnicas: Análise de Pontos de Função, Estimativa gerencial.

7.3. Determinar o Orçamento: o último processo de planejar custos permite gerar o orçamento do projeto.

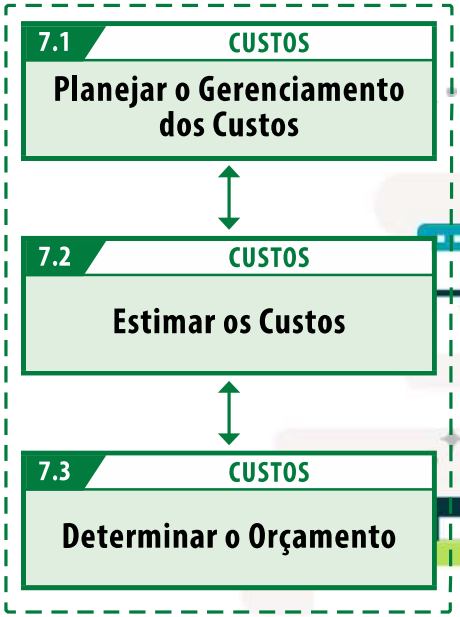

Fonte: PMBOK (2018).

Grupo de Processos de Planejamento

8.1	QUALIDADE
Planejar o Gerenciamento da Qualidade	

Fonte: PMBOK (2018).

O processo de planejamento da área de Qualidade é:
8.1. Planejar o Gerenciamento da Qualidade: consiste em planejar as atividades de qualidade do projeto.

Grupo de Processos de Planejamento

Os processos de Planejamento da área de Recursos são:

9.1. Planejar o Gerenciamento dos Recursos: Consiste de preparar as atividades da área de recursos do projeto.

9.2. Estimar os Recursos das Atividades: para estimar recursos é necessário empregar técnicas ou mesmo estabelecer algum tipo de estimativa *ad hoc*. Ex. de técnicas: Análise de Pontos de Função, Estimativa gerencial.

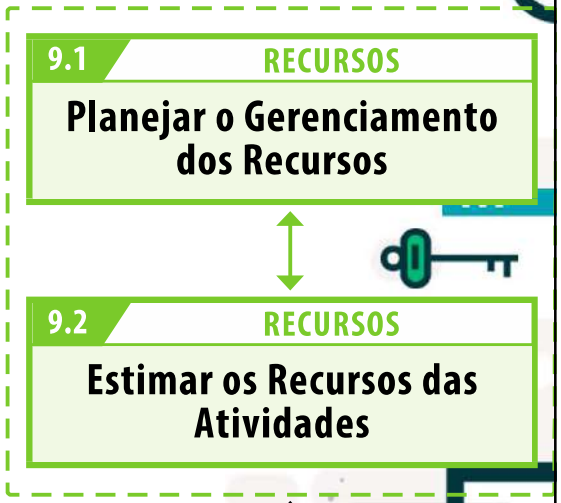

Fonte: PMBOK (2018).

Grupo de Processos de Planejamento

10.1	COMUNICAÇÕES
	Planejar o Gerenciamento das Comunicações

Fonte: PMBOK (2018).

O processo de planejamento da área de Comunicações é:
10.1. Planejar o Gerenciamento das Comunicações: consiste em planejar as atividades de comunicação do projeto.

Grupo de Processos de Planejamento

Os processos de Planejamento da área de Riscos são:

11.1. Planejar o Gerenciamento dos Riscos: Consiste de preparar as atividades da área de riscos do projeto.

11.2. Identificar os Riscos: é necessário identificar os riscos potenciais que deverão ser enfrentados no projeto. Costuma-se utilizar uma lista genérica de riscos com este fim.

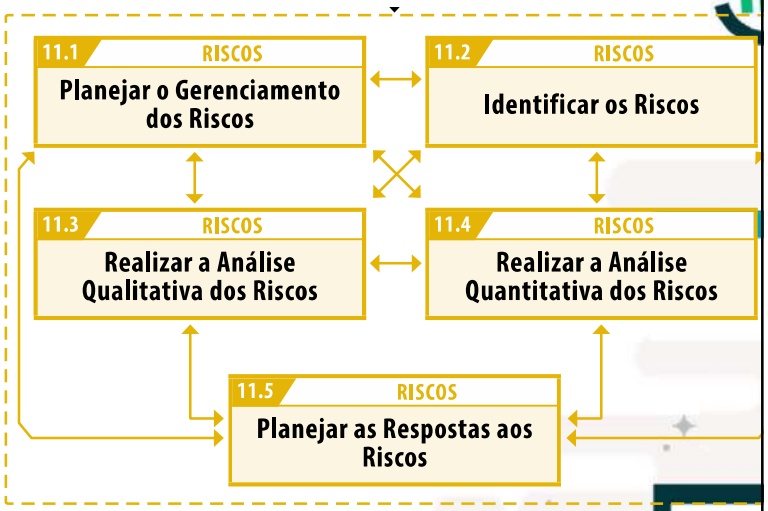

Fonte: PMBOK (2018).

Grupo de Processos de Planejamento

Cont.:

11.3. Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos: consiste em analisar, de forma qualitativa, os riscos do projeto, geralmente cartegorizados em grupos de acordo com o tipo.

11.4. Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos: consiste em analisar, de forma quantitativa, os riscos do projeto, segundo uma escala numérica ou ordinal.

Obs: Os riscos sempre devem ser analisados segundo a perspectiva de seu impacto (dano) X probabilidade de ocorrência.

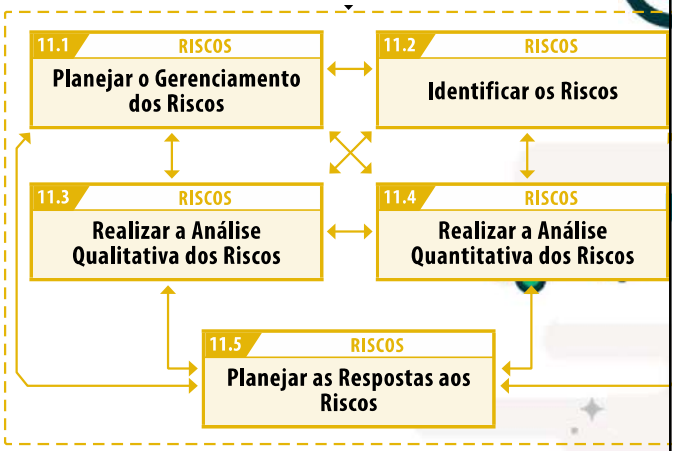

Fonte: PMBOK (2018).

Grupo de Processos de Planejamento

Cont.:

11.5. Planejar as Respostas aos Riscos: consiste em, após analisar e quantificar os riscos, estabelecer respostas a eles.

No caso dos riscos tipo ameaça essas respostas podem ser de 5 tipos:

- Escalar o risco, passando-o a quem possa resolvê-lo.
- Prevenir o risco, eliminando-o.
- Transferir o risco a outro ator.
- Mitigar o risco, tentando reduzir suas consequências.
- Aceitar o risco, conformando-se com ele.

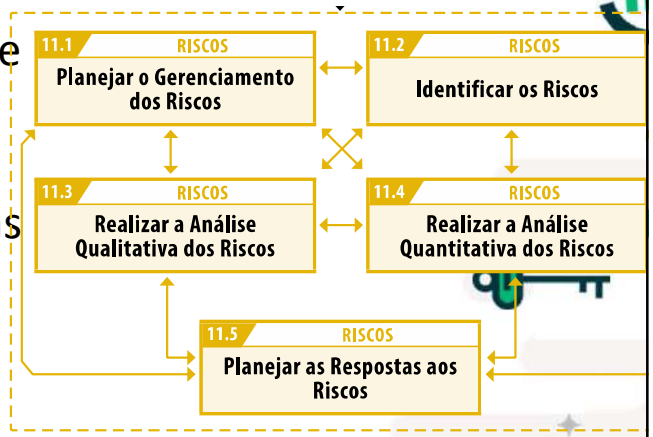

Fonte: PMBOK (2018).

Grupo de Processos de Planejamento

12.1 AQUISIÇÕES

Planejar o Gerenciamento das Aquisições

Fonte: PMBOK (2018).

O processo de planejamento da área de Aquisições é:
12.1. Planejar o Gerenciamento das Aquisições: consiste em planejar as atividades de aquisição do projeto.

Grupo de Processos de Planejamento

13.2	PARTES INTERESSADAS
	Planejar o Engajamento das Partes Interessadas

Fonte: PMBOK (2018).

O processo de planejamento da área de Partes Interessadas é:

13.2. Planejar o Engajamento das Partes Interessadas: consiste em planejar como os *stakeholders* do projeto serão envolvidos de modo a contribuir positivamente para o mesmo.

Referências

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos. 6a. Ed., 2017. ISBN: 978-1-62825-192-0.

VARGAS, R. **PMBOK® GUIDE 6a EDIÇÃO – 49 PROCESSOS GERENCIAMENTO DE PROJETOS.** Disponível em: https://ricardo-vargas.com/pt/pmbok6-processes-flow/. Acesso em: 07/07/2019.
