Processos da Gerência de Projetos (PMBOK)

Prof. Dr. Pedro Alves de Oliveira

Processos do PMBOK 6 (cont.): Processos de Execução

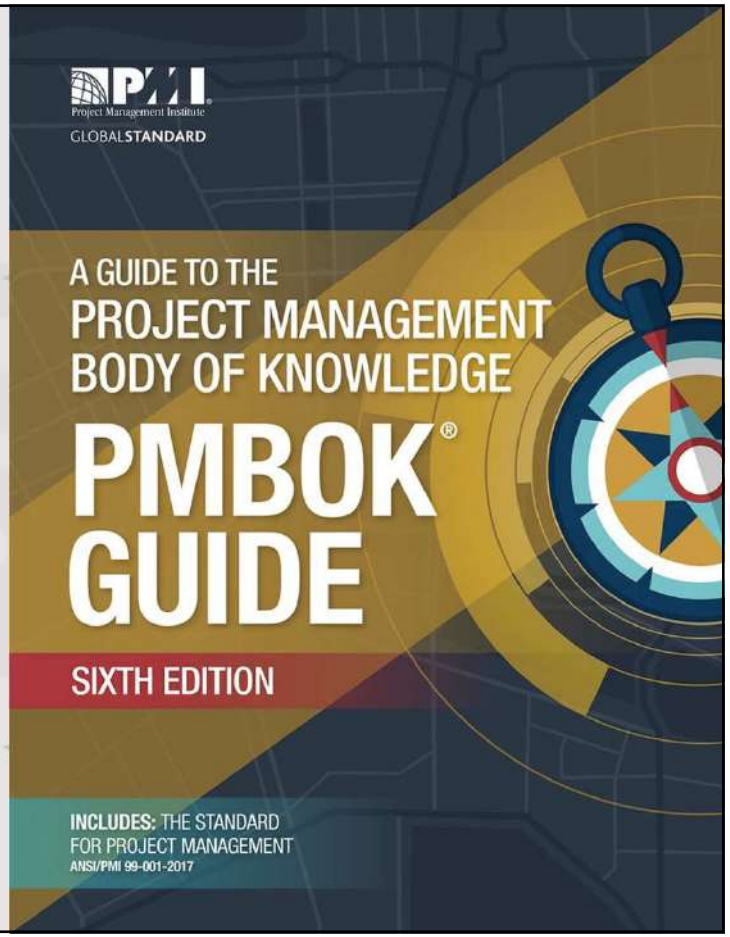

Grupos de Processos de GP

- PMBOK versão 6 agrupa os 49 processos em 5 grupos de processos, a saber:
- Iniciação;
- Planejamento;
- **Execução;**
- Monitoramento e Controle;
- Encerramento.



Grupo de Processos de Execução

Os processos de Execução são responsáveis por executar efetivamente o trabalho principal do projeto, de modo a produzir o **produto/serviço/resultado** esperado.

Para executar um projeto precisamos de “força máxima”. Isto inclui pessoas com diferentes perfis, que compõem a equipe de projeto e que irão se esforçar muito nesta etapa.

O trabalho realizado durante a etapa de execução do projeto é tão intenso que chega a consumir metade ou até mais de todo o esforço do projeto.



Grupo de Processos de Execução

O PMBOK identifica processos de diversas áreas que compõe o grupo de processos de Execução.

Na atual versão do PMBOK estão envolvidas com este grupo de processos as áreas de: Integração, Qualidade, Recursos, Comunicações, Riscos, Aquisições e Partes Interessadas.

Além da participação intensiva da equipe. o gerente do projeto também deve se envolver de maneira significativa com os processos de execução. Na verdade, raramente ele irá executar algum papel operacional, mas ele deve compreendê-los e acompanhá-los.



Grupo de Processos de Execução

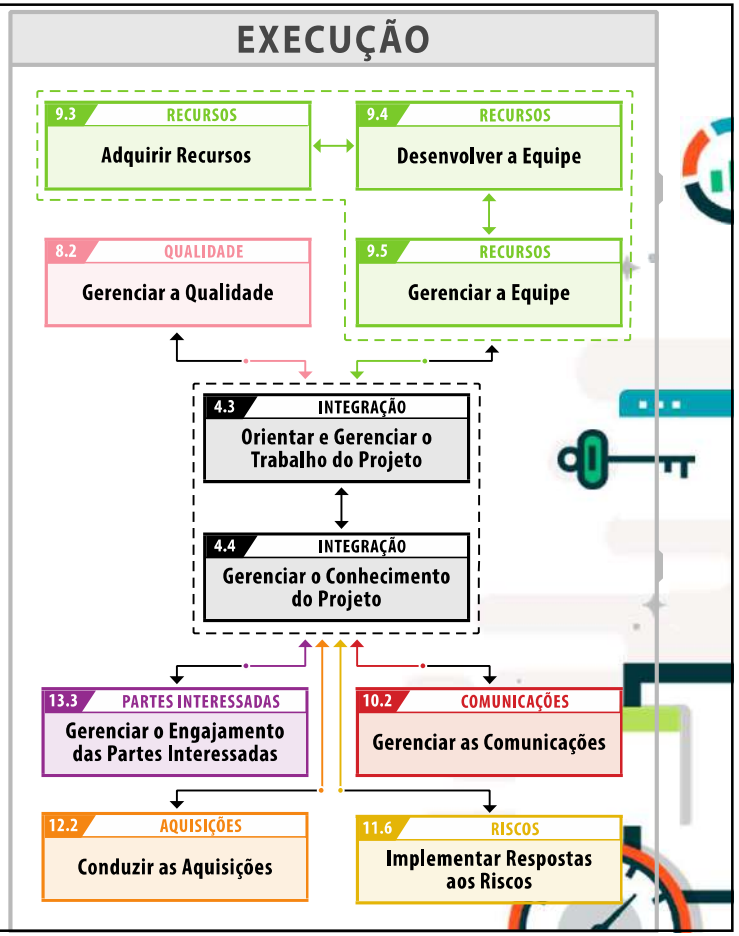

Fonte: PMBOK (2018).

Grupo de Processos de Execução

Os únicos processos da área de Integração que compõem o grupo de processos de Execução são:

4.3 – Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto: este é o processo que caracteriza uma atividade fundamental do gerente de projeto.

4.4 – Gerenciar o Conhecimento do Projeto: o gerente de projeto deve garantir que o conhecimento adquirido durante a execução das atividades não se perca, mas sirva de insumo para outros projetos semelhantes. A isto se chama "lições aprendidas".

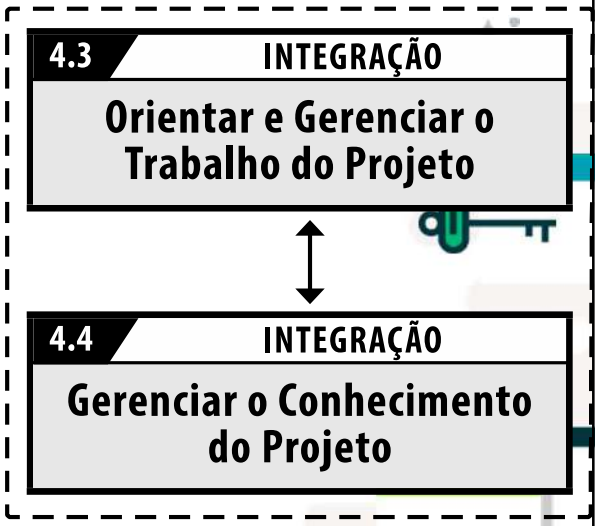

Fonte: PMBOK (2018).

Grupo de Processos de Execução

O único processo da área de Qualidade que compõe o grupo de processos de Execução é:

8.2 – Gerenciar a Qualidade: trata-se de um processo que permite garantir a qualidade almejada para o projeto, aplicando as técnicas de qualidade adequadas durante a execução das atividades.

8.2	QUALIDADE
	Gerenciar a Qualidade

Fonte: PMBOK (2018).

Grupo de Processos de Execução

Os processos da área de Recursos que compõem o grupo de processos de Execução são três:
9.3 – Adquirir Recursos: este processo contempla obter os recursos a serem empregados no projeto.
Observe que devem ser relacionados os recursos cuja finalidade é atender especificamente ao projeto em questão.

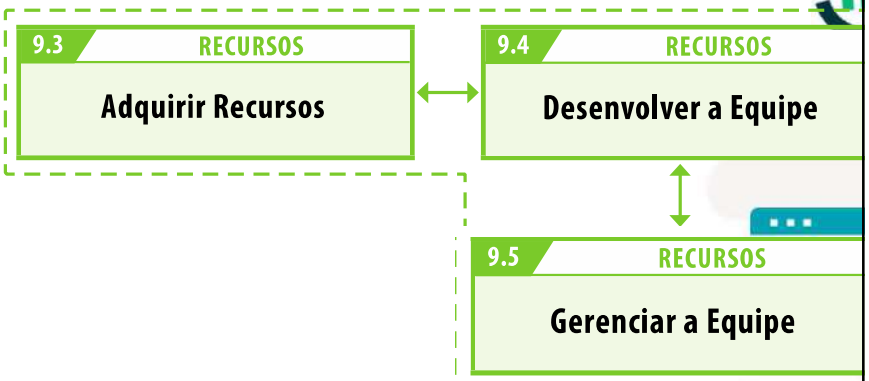

Fonte: PMBOK (2018).

Grupo de Processos de Execução

Cont.:

9.4 – Desenvolver a Equipe: esta atividade envolve preparar a equipe do projeto, ou seja, contratar treinamentos e outros meios que melhorem o nível técnico da equipe do projeto.

9.5 – Gerenciar a Equipe: a atividade de gerenciar a equipe deve ser executada de forma sistemática pelo gerente de projeto, sendo uma condicionante de seu sucesso.

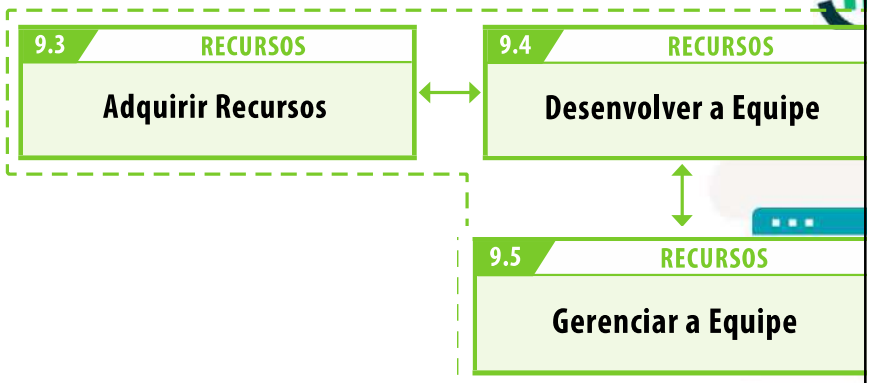

Fonte: PMBOK (2018).

Grupo de Processos de Execução

O único processo da área de Comunicações que compõe o grupo de processos de Execução é:
10.2 – Gerenciar as Comunicações: trata-se de um processo no qual as comunicações, uma área vital para o sucesso de um projeto, são geridas de modo a garantir um processo eficaz de troca de informações entre os *stakeholders*.

10.2	COMUNICAÇÕES
	Gerenciar as Comunicações

Fonte: PMBOK (2018).

Grupo de Processos de Execução

O único processo da área de Riscos que compõe o grupo de processos de Execução é:

11.6 – Implementar Respostas aos Riscos: os riscos de um projeto, uma vez conhecidos e mensurados, devem receber um tratamento por meio de respostas adequadas, dependendo do contexto. Este processo visa implementar essas respostas de forma efetiva, no tempo certo.

11.6	RISCOS
	Implementar Respostas aos Riscos

Fonte: PMBOK (2018).

Grupo de Processos de Execução

O único processo da área de Aquisições que compõe o grupo de processos de Execução é:

12.2 – Conduzir as Aquisições: deve existir um ator que será responsável por conduzir as compras para o projeto, durante a execução das atividades. Pode-se adquirir, por exemplo, softwares necessários para a implementação de um sistema de informação, assim como para a gestão de configurações, etc.

12.2	AQUISIÇÕES
	Conduzir as Aquisições

Fonte: PMBOK (2018).

Grupo de Processos de Execução

O único processo da área de Partes Interessadas que compõe o grupo de processos de Execução é:

12.2 – Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas: neste processo o que está em jogo é o envolvimento adequado dos *stakeholders* do projeto. Gerenciar esse engajamento significa garantir que cada um desses envolvidos possa contribuir para o sucesso do projeto, e ao mesmo tempo ser satisfeito nas suas expectativas.

13.3	PARTES INTERESSADAS
	Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas

Fonte: PMBOK (2018).

Referências

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos. 6a. Ed., 2017. ISBN: 978-1-62825-192-0.

VARGAS, R. **PMBOK® GUIDE 6a EDIÇÃO – 49 PROCESSOS GERENCIAMENTO DE PROJETOS.** Disponível em: https://ricardo-vargas.com/pt/pmbok6-processes-flow/. Acesso em: 07/07/2019.
