Processos da Gerência de Projetos (PMBOK)

Prof. Dr. Pedro Alves de Oliveira

Processos do PMBOK 6 (cont.): Processos de Monitoramento e Controle.

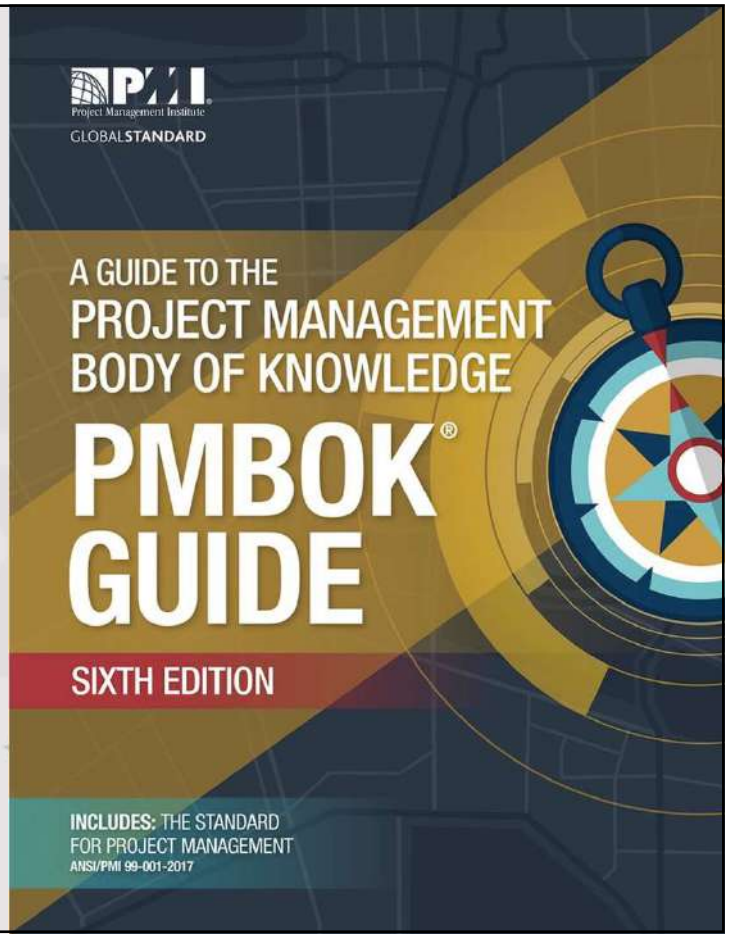

Grupos de Processos de GP

- PMBOK versão 6 agrupa os 49 processos em 5 grupos de processos, a saber:
- Iniciação;
- Planejamento;
- Execução;
- **Monitoramento e Controle;**
- Encerramento.



Grupo de Processos de Monitoramento e Controle

Os processos de Monitoramento e Controle são responsáveis por gerenciar o trabalho do projeto durante todo seu ciclo de vida.

Embora o termo **controle** seja normalmente visto como antipático, pois envolve atitudes como atribuir tarefas e cobrar resultados, é fundamental que isto seja feito nos projetos.

A ausência de controle, por exemplo, sobre o escopo ou a qualidade num projeto tende a gerar resultados insatisfatórios para o cliente.

O monitoramento é um aliado do controle em termos de manter o projeto “nos trilhos”, respeitando o que foi acordado com o cliente.

Grupo de Processos de Monitoramento e Controle

O PMBOK, na atual versão, identifica doze processos de todas as áreas de gerenciamento como componentes do grupo de processos de Monitoramento e Controle.

O papel do gerente do projeto nestes processos é central, devendo este manter uma atitude de liderança e respeito perante a equipe, sem contudo se portar como um “capataz”.

Nesse sentido, as modernas práticas de gerência de projetos preconizam que o gerente se porte como um aliado e não um inimigo da equipe de projeto.

Grupo de Processos de Monitoramento e Controle

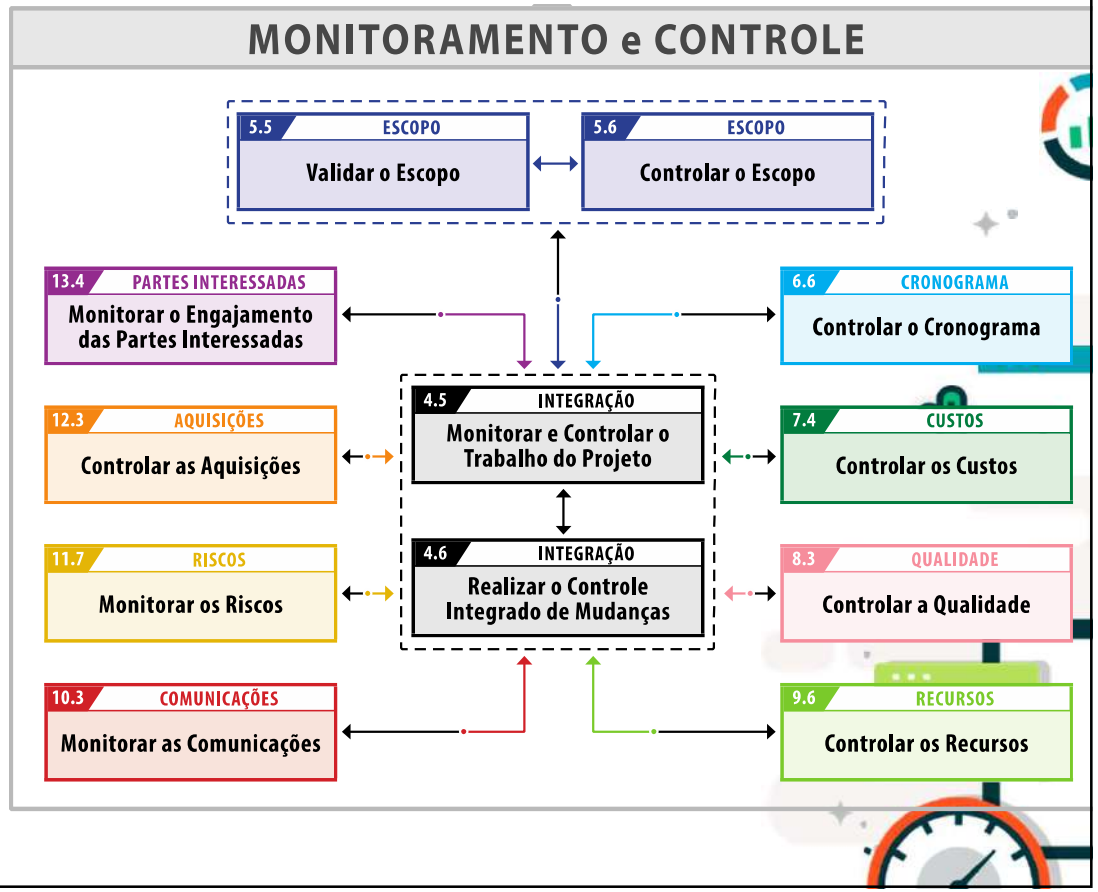

Fonte: PMBOK (2018).

Grupo de Processos de Monitoramento e Controle

Os processos da área de Integração que compõem o grupo de processos de Monitoramento e Controle são:

4.5 – Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto: trata-se de uma atividade que tem como foco o trabalho (esforço) desenvolvido durante o projeto, garantindo que seja aderente ao planejamento realizado.

4.6 – Realizar o Controle Integrado de Mudanças: mudanças em projetos envolvem diversas questões; daí o termo "integrado". Uma mudança, qualquer que seja ela, deve ser aprovada pela equipe e pelo cliente, sendo avaliada em termos de impacto no projeto.

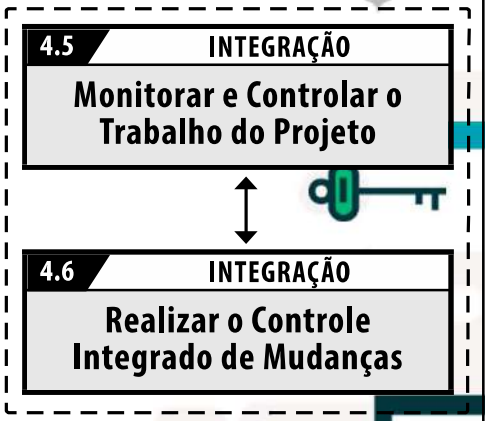

Fonte: PMBOK (2018).

Grupo de Processos de Monitoramento e Controle



Fonte: PMBOK (2018).

Os processos da área de Escopo que compõem o grupo de processos de Monitoramento e Controle são:

5.5 – Validar o Escopo: esta atividade consiste em validar se o escopo do projeto é realmente o que o cliente precisa. Observe que o verbo "validar", aqui utilizado, implica em garantir que o escopo seja realmente cumprido.

5.6 – Controlar o Escopo: o controle do escopo do projeto visa evitar que mudanças indevidas impactem nas condições de conclusão do projeto, o que aumentaria seus riscos.

Grupo de Processos de Monitoramento e Controle

6.6	CRONOGRAMA
	Controlar o Cronograma

Fonte: PMBOK (2018).

O único processo da área de Cronograma que compõe o grupo de processos de Monitoramento e Controle é:
6.6 – Controlar o Cronograma: o controle do cronograma é vital para o sucesso de um projeto. Caso o cronograma se desvie do que foi inicialmente planejado gera-se um conjunto de efeitos que afetarão muitas outras áreas, tais como custo, qualidade, recursos e assim por diante.

Grupo de Processos de Monitoramento e Controle

7.4	CUSTOS
	Controlar os Custos

Fonte: PMBOK (2018).

O único processo da área de Custos que compõe o grupo de processos de Monitoramento e Controle é:

7.4 – Controlar os Custos: o controle do orçamento de um projeto afeta diretamente os principais *stakeholders*, incluindo o cliente e o financiador. Em muitos casos o aumento do custo de um projeto gera consequências tão significativas que este pode vir a ser paralisado ou até mesmo abortado.

Grupo de Processos de Monitoramento e Controle

8.3	QUALIDADE
	Controlar a Qualidade

Fonte: PMBOK (2018).

O único processo da área de Qualidade que compõe o grupo de processos de Monitoramento e Controle é:
8.3 – Controlar a Qualidade: a qualidade obtida num projeto é fruto de um conjunto de ações que não são executadas de forma isolada. Os principais autores dessa área consideram que qualidade não é um "ingrediente a mais" no projeto; ao contrário, deve ser algo cultural e intrínseco às atividades realizadas. Cada processo deve possuir suas métricas de qualidade e estas devem ser aplicadas.

Grupo de Processos de Monitoramento e Controle

9.6	RECURSOS
	Controlar os Recursos

Fonte: PMBOK (2018).

O único processo da área de Recursos que compõe o grupo de processos de Monitoramento e Controle é:
9.6 – Controlar os Recursos: segundo PMBOK (2018) é "o processo de garantir que os recursos físicos atribuídos e alocados ao projeto estejam disponíveis conforme planejado, bem como monitorar o uso planejado versus o uso real de recursos e executar ações corretivas, conforme necessário."

Grupo de Processos de Monitoramento e Controle

10.3	COMUNICAÇÕES
Monitorar as Comunicações	

Fonte: PMBOK (2018).

O único processo da área de Comunicações que compõe o grupo de processos de Monitoramento e Controle é:
10.3 – Monitorar as Comunicações: esta é uma atividade cujo objetivo é acompanhar o processo de troca de informações entre os atores do projeto. Deve ser provida uma boa comunicação, com fluidez e bom entendimento do que está sendo comunicado.

Grupo de Processos de Monitoramento e Controle

11.7	RISCOS
	Monitorar os Riscos

Fonte: PMBOK (2018).

O único processo da área de Riscos que compõe o grupo de processos de Monitoramento e Controle é:

11.7 – Monitorar os Riscos: riscos variam ao longo do projeto e por este motivo devem ser revistos de tempos em tempos. Alguns riscos que foram inicialmente identificados podem deixar de existir, enquanto novos riscos podem surgir. Caso não se tenha o devido cuidado com estas questões pode-se caminhar para uma situação de inviabilidade de conclusão do projeto.

Grupo de Processos de Monitoramento e Controle

12.3	AQUISIÇÕES
Controlar as Aquisições	

Fonte: PMBOK (2018).

O único processo da área de Aquisições que compõe o grupo de processos de Monitoramento e Controle é:
12.3 – Controlar as Aquisições: aquisições constituem atividades por vezes complexas e burocráticas. Faz-se necessário especificar, orçar, efetivar a compra, receber, conferir e disponibilizar os insumos para o projeto. Essas tarefas devem possuir responsáveis e ser acompanhadas por algum ator que conheça o que está sendo comprado. Todo esse cuidado visa garantir que se realize boas compras e a tempo.

Grupo de Processos de Monitoramento e Controle

13.4	PARTES INTERESSADAS
	Monitorar o Engajamento das Partes Interessadas

Fonte: PMBOK (2018).

O único processo da área de Partes Interessadas que compõe o grupo de processos de Monitoramento e Controle é:
13.4 – Monitorar o Engajamento das Partes Interessadas: todos os *stakeholders* do projeto devem ser conhecidos e, uma vez conhecidos, devem ser monitorados no sentido de saber suas “dores” e, ao mesmo tempo, garantir que possam contribuir efetivamente para o sucesso do projeto. Sem um monitoramento efetivo desses envolvidos não se consegue chegar a bom termo num projeto.

Grupo de Processos de Monitoramento e Controle

Monitoramento e Controle de projetos constitui um grupo de processos nos quais o gerente de projeto deve se envolver fortemente.

Juntamente com o Planejamento, este é o grupo de processos que caracterizam a maior parte das ações realizadas pelo gerente, sendo a parte “nobre” de sua atuação.

Projetos bem planejados e bem controlados tendem a ser bem sucedidos, mas estas atividades demandam muita formação e experiência do profissional. Ou seja, isto não deve ser delegado a qualquer um.

Grupo de Processos de Monitoramento e Controle

Os métodos e técnicas de monitoramento e controle são bastante variados e devem ser adaptados a cada contexto de projeto.
De modo geral aconselha-se utilizar:

- Estimativa e medição por métodos numéricos / estatísticos;
- Acompanhamento baseado em indicadores;
- Gráficos e painéis de monitoramento (tipo *dashboards*);
- Monitoramento em tempo real (se possível) ou pelo menos com frequência constante;
- Envolver toda a equipe, pois quem deve dar *feedback* sobre o andamento do projeto é a própria equipe.



Grupo de Processos de Monitoramento e Controle

Lembre-se da velha máxima, tão conhecida e tão pouco aplicada nos projetos em geral:

“Não se pode gerenciar o que não se consegue medir.”

Então fica para você um desafio: comece hoje mesmo a definir meios de medir seus projetos. Tente medir tudo que puder: qualidade, tempo, custo, recursos, tamanho dos artefatos.

Faça isto e boa sorte!

Referências

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos. 6a. Ed., 2017. ISBN: 978-1-62825-192-0.

VARGAS, R. **PMBOK® GUIDE 6a EDIÇÃO – 49 PROCESSOS GERENCIAMENTO DE PROJETOS.** Disponível em: https://ricardo-vargas.com/pt/pmbok6-processes-flow/. Acesso em: 07/07/2019.
