Processos da Gerência de Projetos (PMBOK)

Prof. Dr. Pedro Alves de Oliveira

Processos do PMBOK 6 (cont.): Processos de Encerramento.

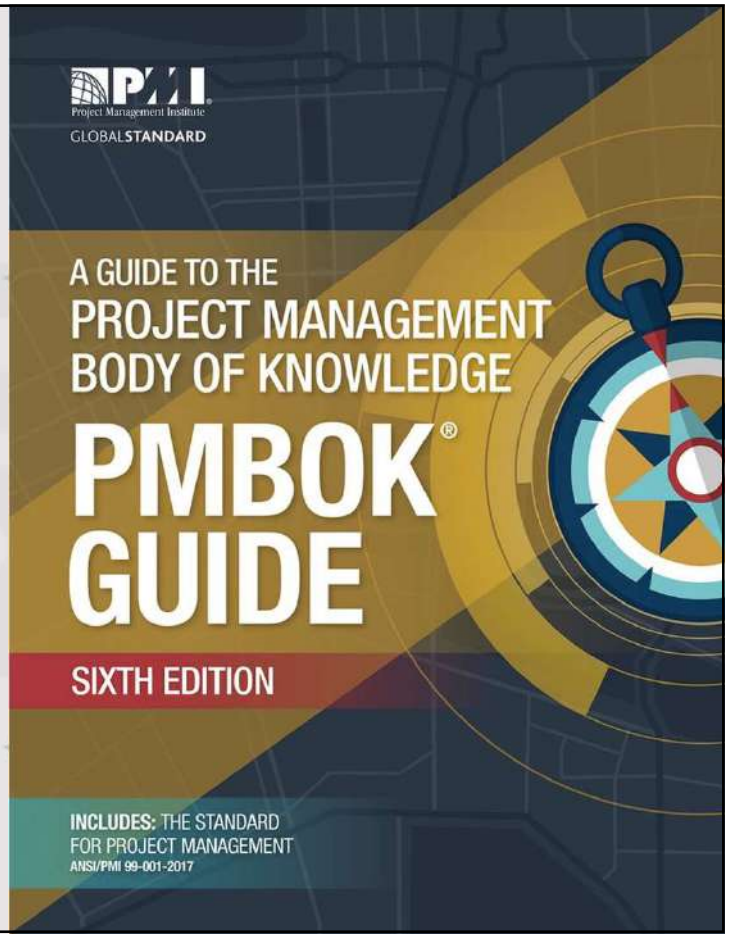

Grupos de Processos de GP

- PMBOK versão 6 agrupa os 49 processos em 5 grupos de processos, a saber:
- Iniciação;
- Planejamento;
- Execução;
- Monitoramento e Controle;
- **Encerramento**.



Grupo de Processos de Encerramento

O grupo de processos de Encerramento deve ser encarado como um momento crucial para completar bem as atividades que compõem uma fase ou o projeto como um todo.

É a etapa na qual deve-se fazer a desmobilização de ativos e a liberação de recursos, reduzindo de maneira drástica a quantidade de pessoas envolvidas com as atividades de projeto.



Grupo de Processos de Encerramento

Esta etapa pode consumir em torno de 10 a 15% de todo o trabalho do projeto, dependendo de como serão feitas essas atividades, que incluem geralmente a migração de bases de dados, a liberação para a produção, o fechamento da documentação, treinamento dos usuários, etc.

Observe que finalizar um projeto não signifca, necessariamente, que todos os artefatos esperados estão sendo entregues.



Grupo de Processos de Encerramento

Veja, por exemplo, a distribuição de esforço típica de um projeto baseado no Processo Unificado (RUP):

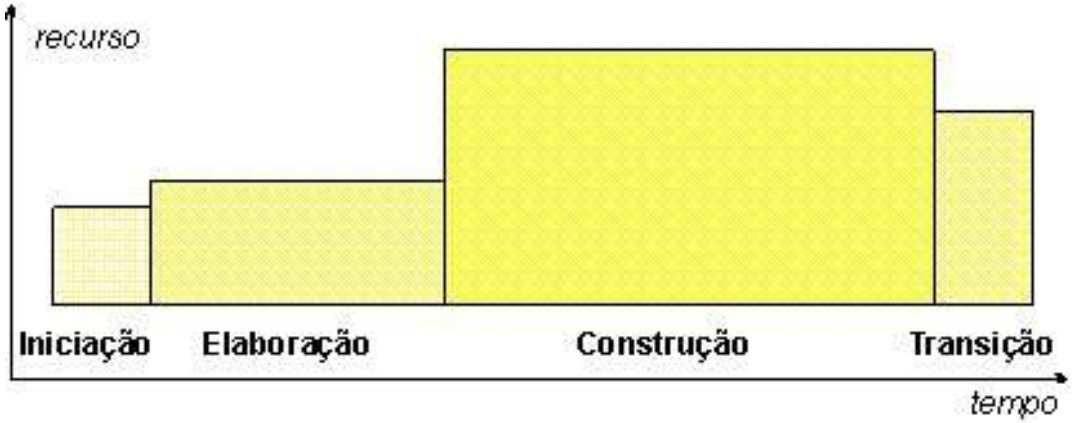

10% 30% 50% 10%

Grupo de Processos de Encerramento

O único processo da área de Integração que compõe o grupo de processos de Encerramento é:

4.7 – Encerrar o Projeto ou Fase: é importante concluir de forma adequada um projeto ou uma fase de um projeto, de maneira que se possa avaliar seu sucesso ou insucesso, e ao mesmo tempo obter *feedback* dos principais envolvidos. Um bom projeto é aquele que atende a todos que dele participam, sem desconsiderar seus interesses.

4.7	INTEGRAÇÃO
	Encerrar o Projeto ou Fase

Fonte: PMBOK (2018).

Grupo de Processos de Encerramento

Visando garantir o bom encerramento de um projeto ou de uma fase pode-se trabalhar com indicadores, que permitam aferir se os resultados foram alcançados.

É fundamental, nessa etapa, obter do cliente um aceite formal, dos produtos entregues, de modo a garantir que o cliente não venha a requerer, posteriormente, algum tipo de ressarcimento por artefatos combinados e não entregues.

O Termo de Aceite é um artefato simples, um texto no qual devem constar os produtos entregues, possuindo um espaço para assinatura do cliente.

Termo de aceite

TERMO DE ACEITE DE ENTREGA ( ) PARCIAL ( ) TOTAL	EMPRESA
Nome do Projeto	

Objetivo

[Descreva o motivo pelo qual esse documento será usado.]

Este documento formaliza o aceite da entrega considerando-a em conformidade com os requisitos e os critérios de aceitação definidos.

Entrega

[Descrever a entrega com seus requisitos e critérios de aceitação ou referencie o documento que será anexado.]

Questões em Aberto

[Usar caso haja alguma questão pendente em relação à entrega. Retirar a seção caso não houver nenhum ponto em aberto.]

Questão em aberto	Responsável	Previsão

Informações adicionais

Aceite da Entrega		
Os participantes abaixo atestam o cumprimento dos requisitos e dos critérios de aceitação da entrega.		
Participante	**Assinatura**	**Data**
Patrocinador do Projeto		
Gerente do Projeto		
Cliente		

Obs: adaptado de "Escritório de Projetos", disponível em: https://escritoriodeprojetos.com.br/component/jdownloads/send/8-modelos/9-termo-de-aceite-da-entrega. Acesso em: 11/11/2019.

Grupo de Processos de Encerramento

Exemplos de indicadores que podem ser obtidos ao final do projeto:

- Produtividade obtida no projeto;
- Quantidade de erros encontrados no código produzido;
- Total de alterações realizadas no produto e seu impacto;
- Desvios de cronograma e seu custo no projeto;
- Etc.



Referências

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos. 6a. Ed., 2017. ISBN: 978-1-62825-192-0.

VARGAS, R. **PMBOK® GUIDE 6a EDIÇÃO – 49 PROCESSOS GERENCIAMENTO DE PROJETOS.** Disponível em: https://ricardo-vargas.com/pt/pmbok6-processes-flow/. Acesso em: 07/07/2019.
