

Processos da Gerência de Projetos (PMBOK)

Prof. Dr. Pedro Alves de Oliveira



Áreas de Gerência de Projetos do PMBOK 6: - Integração



A GUIDE TO THE
PROJECT MANAGEMENT
BODY OF KNOWLEDGE

PMBOK® GUIDE

SIXTH EDITION

INCLUDES: THE STANDARD
FOR PROJECT MANAGEMENT
ANSI/PMI 99-001-2017



Roteiro:

- Conceito de Integração
- Processos de Integração
- Artefatos de Integração



Conceito de Integração

Integração pode ser vista como uma “cola” entre as demais áreas do Guia PMBoK, ficando numa posição central em relação a todas elas.



Conceito de Integração

Integrar pode ser entendido como: juntar as partes, de forma a compor o todo (integral).

O que deve ser integrado num projeto?

- *Stakeholders* (Pessoas)
- Áreas funcionais
- Atividades envolvidas




Áreas de conhecimento	Grupos de processos de gerenciamento de projetos				
	Grupo de processos de iniciação	Grupo de processos de planejamento	Grupo de processos de execução	Grupo de processos de monitoramento e controle	Grupo de processos de encerramento
4. Gerenciamento da integração do projeto	4.1 Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto	4.2 Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto	4.3 Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto 4.4 Gerenciar o Conhecimento do Projeto	4.5 Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto 4.6 Realizar o Controle Integrado de Mudanças	4.7 Encerrar o Projeto ou Fase

Fonte: PMBoK, 6ª. ed

Principais artefatos da área de Integração:

Termo de Abertura de Projeto (TAP): é elaborado no início do projeto e mantido intacto até o final do mesmo.


- É um documento bem inicial, uma visão macro do projeto e por isso mesmo é bem resumido (max. 2 páginas).
- Um exemplo de TAP foi apresentado no material referente à Iniciação do Projeto.

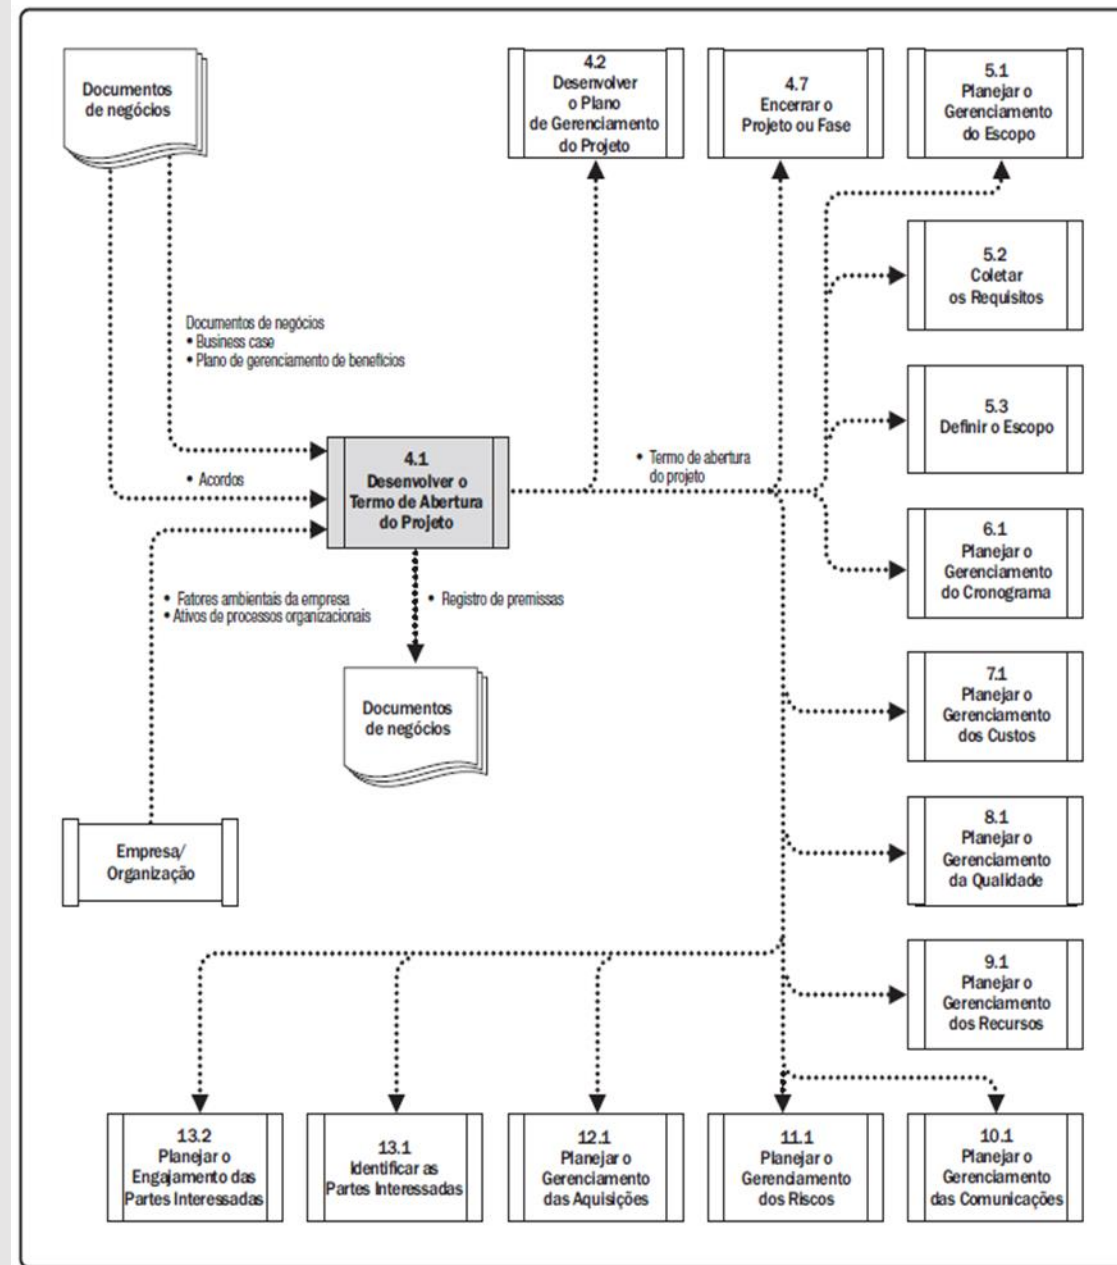

Principais artefatos da área de Integração:

Plano de Gerenciamento do Projeto ou Plano de Projeto: é elaborado durante o planejamento do projeto e pode ser alterado a qualquer tempo, até o final.

- É um documento bem mais completo que o TAP, com um detalhamento de tudo que deve ser realizado no projeto.
- Deve contemplar todas as áreas de gerência de projeto.

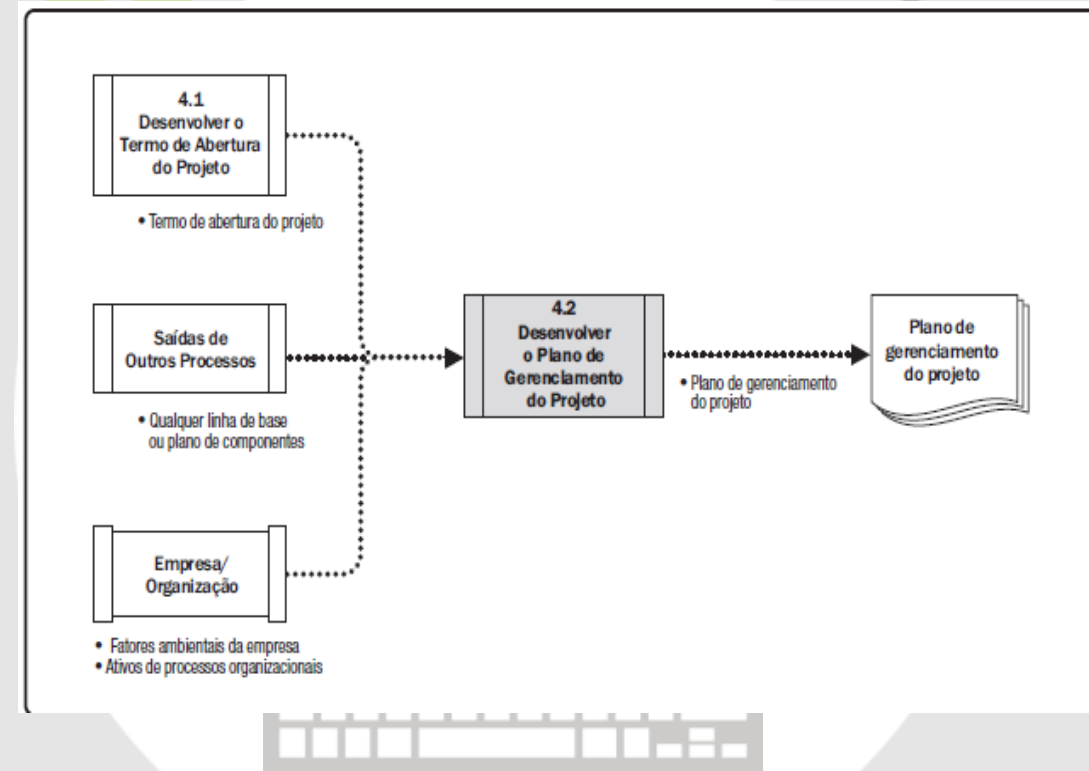

Principais artefatos da área de Integração:

Solicitação de Mudança no Projeto: é elaborado quando se idêntica a necessidade de realizar alterações substanciais no projeto, tal como uma mudança de escopo com impacto sobre o cronograma e o custo.

Formulário de Solicitação de Mudança no Projeto (Form 1). O formulário contém campos para identificação do projeto, cliente, e detalhes da mudança. Um ícone de PDF está sobreposto no lado direito.

Form 1 - SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA NO PROJETO			
1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO			
1.1 NOME DO CLIENTE/EMPRESA AQUI			
1.2 NOME DO TÍTULO DO PROJETO AQUI			
1.3 Data			
1.4 Data de emissão			
1.5 Data de validade			
1.6 Data de revisão			
1.7 Data de aprovação			
1.8 Data de rejeição			
1.9 Data de cancelamento			
1.10 Data de encerramento			
1.11 Data de início			
1.12 Data de término			
1.13 Data de entrega			
1.14 Data de pagamento			
1.15 Data de entrega final			
1.16 Data de entrega parcial			
1.17 Data de entrega parcial			
1.18 Data de entrega parcial			
1.19 Data de entrega parcial			
1.20 Data de entrega parcial			
1.21 Data de entrega parcial			
1.22 Data de entrega parcial			
1.23 Data de entrega parcial			
1.24 Data de entrega parcial			
1.25 Data de entrega parcial			
1.26 Data de entrega parcial			
1.27 Data de entrega parcial			
1.28 Data de entrega parcial			
1.29 Data de entrega parcial			
1.30 Data de entrega parcial			
1.31 Data de entrega parcial			
1.32 Data de entrega parcial			
1.33 Data de entrega parcial			
1.34 Data de entrega parcial			
1.35 Data de entrega parcial			
1.36 Data de entrega parcial			
1.37 Data de entrega parcial			
1.38 Data de entrega parcial			
1.39 Data de entrega parcial			
1.40 Data de entrega parcial			
1.41 Data de entrega parcial			
1.42 Data de entrega parcial			
1.43 Data de entrega parcial			
1.44 Data de entrega parcial			
1.45 Data de entrega parcial			
1.46 Data de entrega parcial			
1.47 Data de entrega parcial			
1.48 Data de entrega parcial			
1.49 Data de entrega parcial			
1.50 Data de entrega parcial			
1.51 Data de entrega parcial			
1.52 Data de entrega parcial			
1.53 Data de entrega parcial			
1.54 Data de entrega parcial			
1.55 Data de entrega parcial			
1.56 Data de entrega parcial			
1.57 Data de entrega parcial			
1.58 Data de entrega parcial			
1.59 Data de entrega parcial			
1.60 Data de entrega parcial			
1.61 Data de entrega parcial			
1.62 Data de entrega parcial			
1.63 Data de entrega parcial			
1.64 Data de entrega parcial			
1.65 Data de entrega parcial			
1.66 Data de entrega parcial			
1.67 Data de entrega parcial			
1.68 Data de entrega parcial			
1.69 Data de entrega parcial			
1.70 Data de entrega parcial			
1.71 Data de entrega parcial			
1.72 Data de entrega parcial			
1.73 Data de entrega parcial			
1.74 Data de entrega parcial			
1.75 Data de entrega parcial			
1.76 Data de entrega parcial			
1.77 Data de entrega parcial			
1.78 Data de entrega parcial			
1.79 Data de entrega parcial			
1.80 Data de entrega parcial			
1.81 Data de entrega parcial			
1.82 Data de entrega parcial			
1.83 Data de entrega parcial			
1.84 Data de entrega parcial			
1.85 Data de entrega parcial			
1.86 Data de entrega parcial			
1.87 Data de entrega parcial			
1.88 Data de entrega parcial			
1.89 Data de entrega parcial			
1.90 Data de entrega parcial			
1.91 Data de entrega parcial			
1.92 Data de entrega parcial			
1.93 Data de entrega parcial			
1.94 Data de entrega parcial			
1.95 Data de entrega parcial			
1.96 Data de entrega parcial			
1.97 Data de entrega parcial			
1.98 Data de entrega parcial			
1.99 Data de entrega parcial			
1.100 Data de entrega parcial			

Impacto da Mudança no Projeto

	Baixo	Médio	Alto
GERAL			
Tempo			
Escopo			
Preço			
Qualidade			
Risco			
Comunicação			
Recursos			
Assinaturas			
Outros			

Impacto no Prazo

De	Para

Impacto no Custo

De	Para

Descrição da Mudança

DESCREVA A MUDANÇA SOLICITADA

Razão para a Mudança

DIGITE AS RAZÕES PARA A MUDANÇA SOLICITADA

Solicitado por


DIGITE O NOME	Assinatura	Assinatura

Principais artefatos da área de Integração:

Termo de aceite do projeto ou fase: é elaborado quando do encerramento de um projeto ou fase e atesta que o que foi pedido foi entregue ao cliente.

- É um documento cuja finalidade principal é resguardar o fornecedor de eventuais problemas de escopo ou entrega incompleta.

- O documento de aceite do projeto também é conhecido pelo nome **Termo de Encerramento de Projeto** ou **Relatório Final**.

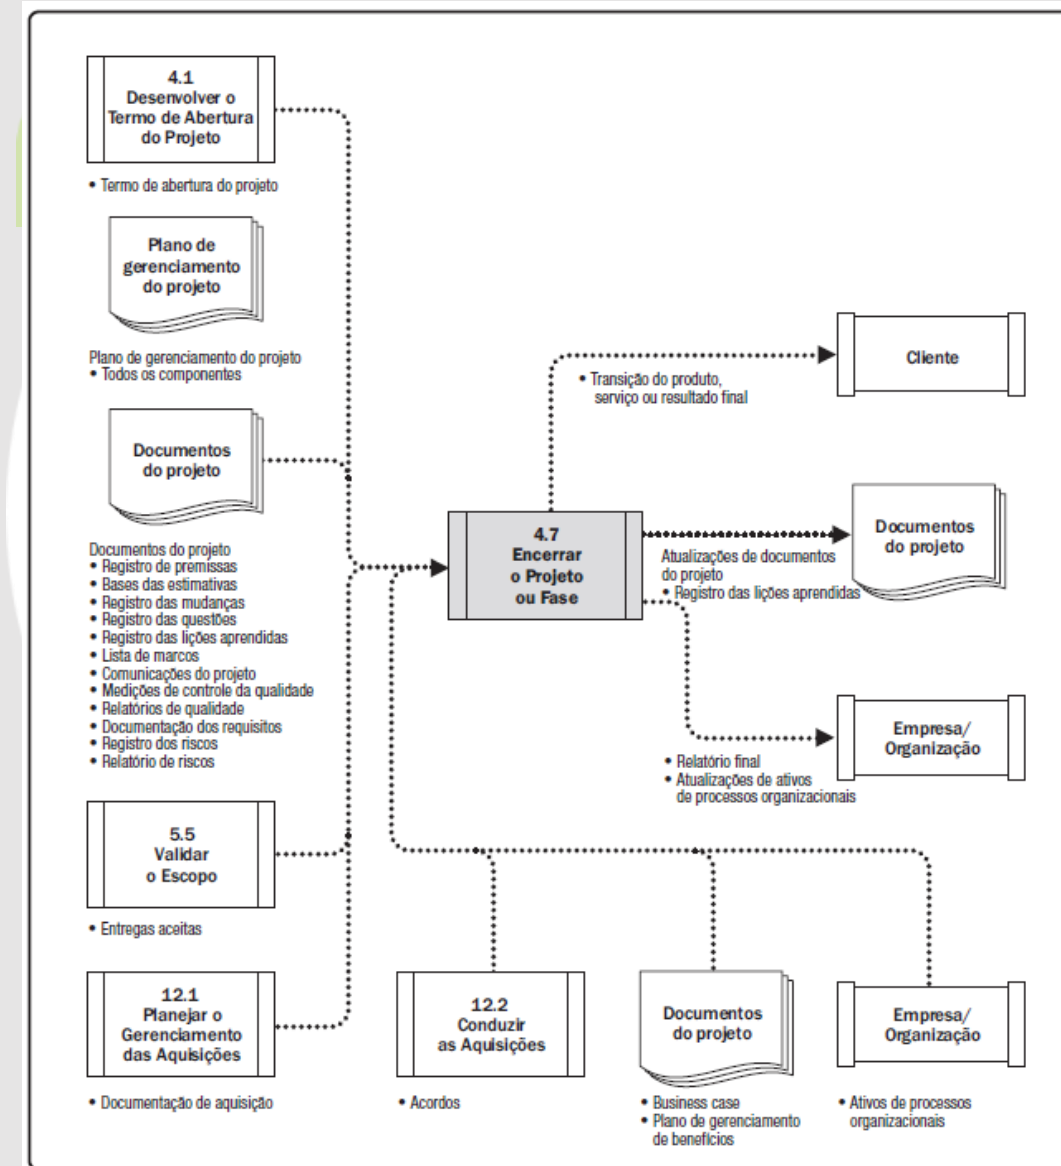

Referências

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos. 6a. Ed., 2017. ISBN: 978-1-62825-192-0.

VARGAS, R. **PMBOK® GUIDE 6a EDIÇÃO – 49 PROCESSOS GERENCIAMENTO DE PROJETOS**. Disponível em: <https://ricardo-vargas.com/pt/pmbok6-processes-flow/>. Acesso em: 07/07/2019.

